



**JUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO**

**INFORME TRIMESTRAL
Octubre –diciembre 2022**



Contenido

1	Del estado que guarda la Administración.....	3
1.1	Ejercicio general de recursos presupuestales por capítulo de gasto.....	3
1.2	Ejercicio presupuestal. Ramo 33.....	4
2	Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”	6
2.1	Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	6
2.2	Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	6
2.3	Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.....	7
2.3.1	Componente 1. Agua Potable.....	7
2.3.2	Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.....	8
2.3.3	Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.....	10
2.3.4	Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.....	11
2.3.5	Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.....	13
2.3.6	Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador.....	15
3	Reportes ciudadanos. Comparativo trimestral.....	18
4	Gestión de Programa Obra 2022.....	19
5	Gestión de Adquisiciones.....	22
6	Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.....	23
7	Factibilidades.....	26
8	Comunicación Social.....	30
9	Seguimiento a principales proyectos estratégicos.....	31
10	Anexos.....	31



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

1 Del estado que guarda la Administración.

1.1 Ejercicio general de recursos presupuestales por capítulo de gasto.

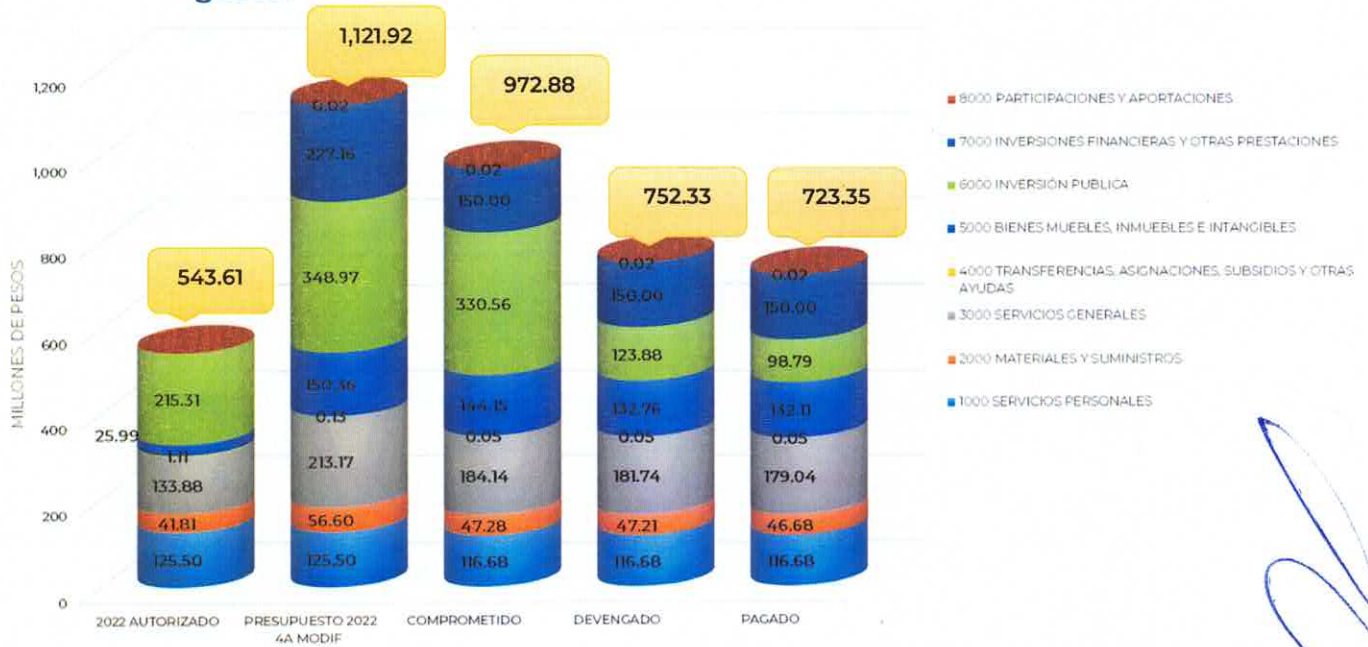


Gráfico 1. Presupuesto de egresos cierre ejercicio 2022.

Al cierre de la anualidad 2022, el presupuesto de la cuarta modificación alcanzó un importe de 1 mil 121 millones de pesos, consolidando recursos propios asignados a proyectos de fortalecimiento institucionales, presupuesto de inversión destinado a obra pública proveniente del Ramo 33 municipal y estatal, así como del PROAGUA y PRODDER de la CONGUA, como principales adiciones.

En cuanto al ejercicio concentrado de gasto por capítulo presupuestal, a cierre de diciembre tenía comprometido el 87% del presupuesto modificado, del cual 64.5% se pagó durante el 2022. El resto del recurso solicitado como refrendo para pago durante la anualidad 2023. El principal capítulo pendiente de ejercer es el asociado al capítulo 6000, debido a que el 74% de las obras del programa se contrató en el último trimestre del año anterior.

El detalle del estado de situación presupuestal al cierre se presente en el anexo A del presente informe. La tabla 1 a continuación presenta un cuadro resumen por capítulo de gasto respecto del avance de situación presupuestal que se informa.

Tabla 1. Cierre del ejercicio presupuestal del ejercicio.

	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022 4A MODIF	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	125.50	116.68	93.0	116.68	93.0	116.68	93.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.60	47.28	83.5	47.21	83.4	46.68	82.5
3000	SERVICIOS GENERALES	213.17	184.14	86.4	181.74	85.3	179.04	84.0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.13	0.05	37.5	0.05	37.5	0.05	37.5
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150.36	144.15	95.9	132.76	88.3	132.11	87.9
6000	INVERSIÓN PUBLICA	348.97	330.56	94.7	123.88	35.5	98.79	28.3
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	227.16	150.00	66.0	150.00	66.0	150.00	66.0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.02	0.02	76.0	0.02	76.0	0.02	76.0
	TOTAL, PRESUPUESTO 2022	1121.92	972.88	86.7	752.33	67.1	723.35	64.5

1.2 Ejercicio presupuestal. Ramo 33

En cuanto a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS -Ramo 33, se contrataron recursos por un importe total de 66 millones 389, mil pesos, de los cuales 44 millones 764 mil fueron de origen municipal y 21 millones 625 estatal. Al cierre de la anualidad las obras se encontraban en proceso de ejecución, se presenta detalle en la tabla 2.

Tabla 2. Obras financiadas con Ramo 33. Ejercicio 2022.

	66,389,957	44,764,627	21,625,331
Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Municipal (FAISM-R33)	FAIS Estatal
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES NUEVA ITALIA, FRACCION EL CUAYABO Y LOS CISNEROS	1,996,965	998,483	998,483
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE BERNALES (ETAPA TRES DE TRES)	3,963,885	1,981,942	1,981,942
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. CD. DEPORTIVA (1ERA ETAPA)	5,991,108	2,995,554	2,995,554
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA CASA BLANCA Y COLONIA CD. DEPORTIVA, EN LAS CALLES JOAQUIN CAPILLA, RICARDO DELGADO, MARTIN DIAZ Y DANIEL BAUTISTA.	5,986,457	2,993,229	2,993,229
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. JARDINES DEL VALLE (1ERA ETAPA)	5,990,959	2,995,480	2,995,480
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA HACIENDA (1ERA ETAPA).	4,978,756	2,489,378	2,489,378
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COL. CAMPESTRE HURTADO. (1ER ETAPA).	4,996,492	2,498,246	2,498,246
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LAS TROJES (1ERA ETAPA).	4,441,243	3,245,859	1,195,384
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO.	2,393,155	2,393,155	-
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ.	781,656	781,656	-
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: GUADALUPE VICTORIA Y ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA III	998,500	998,500	-
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LUIS H. DUCOING Y PRIVADA RUIZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANITA	1,799,307	1,799,307	-
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL, LA LOMITA, DEL CANAL, ANTONIO GARCIA, AV. DEL TRABAJO Y PRIV. SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE MARQUEZ	4,050,933	4,050,933	-
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, GUADALUPE VICTORIA E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CUCHICUATO.	2,249,311	2,249,311	-
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	1,597,811	1,597,811	-
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA SAN GABRIEL 1RA SECCION, 1RA ETAPA	4,047,724	2,023,862	2,023,862
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (COLONIA SAN GABRIEL 2DA SECCION), 2DA ETAPA.	2,907,548	1,453,774	1,453,774
REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JUAREZ (HERMANO MATEO).	2,798,874	2,798,874	-
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA.	1,684,608	1,684,608	-
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA, MUÑIZ, PEDREGAL, AV. CARRETERA, JUVENTINO ROSAS Y CUATRO CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA.	2,734,665	2,734,665	-

2 Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”

2.1 Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo		Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
FIN	Contribuir a garantizar a la población, el acceso a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, mediante el consumo sostenible de los recursos hídricos.	Dotación de agua por habitante	213.09	230	Litros/habitante/día
		Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	94.98%	100%	Aguas saneadas/ Aguas residuales recibidas

Respecto del cumplimiento de indicadores estratégicos para el nivel fin, al cierre del ejercicio 2022 en promedio el Organismo alcanzó un cumplimiento de 93.81%.

2.2 Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo		Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
PROPÓSITO	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables -agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento-, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	Continuidad del servicio de agua potable en toma	0.54	0.60	Horas servicio/24
		Porcentaje de solución en puntos de encharcamiento	28.57%	100%	Puntos atendidos/ Puntos programados
		Vigilancia de la calidad del agua en pozos, potabilizadoras y PTAR's	78.20%	100%	Muestras realizadas/ Muestras programadas

En cuanto a los indicadores de desempeño asociados al propósito del programa presupuestario, al cierre el promedio alcanzado fue de 65.59%. Lo anterior asociado principalmente a que la contratación de obras relacionadas con la solución de puntos de encharcamiento se llevó a cabo en el último mes del año, por lo cual a la fecha que se informa se encontraban en ejecución.



2.3 Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.

2.3.1 Componente 1. Agua Potable.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicio público de agua potable eficiente y promoción de consumo de agua tratada, apegados al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos.	Presión del servicio de agua potable en toma	0.79	0.60	Kg/cm ²
	Porcentaje de atención de reportes por fugas	96%%	95%	Eventos reportados/ Eventos solucionados
	Porcentaje de fuentes de abastecimiento con mantenimientos realizados	150.00%	100%	Sistemas de cloración actualizados/ Sistemas de cloración programados
	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm ²	112.13%	100%	Colonias con servicios programados/ Colonias programadas

En cuanto a los indicadores del plan de trabajo de la Subgerencia de Servicios de agua se superaron las metas establecidas con promedio general de 123.48%, es decir un desempeño mejor de lo esperado.

Entregables operativos del componente SERVICIOS DE AGUA				
Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño	
Número de horas de servicio continuo medido en los domicilios de los puntos críticos de las colonias (horas)	12,96	14.4	90%	Horas
Volumen de agua extraído de las fuentes de abastecimiento en operación	42,191,641	44,162,817	95.54%	Metros cúbicos
Número de folios realizados/atendidos respecto de fugas identificadas	9,565	9,976	95.88%	Fugas atendidas
Elevar el nivel de servicio en términos de continuidad y presión	127	113	112.39%	Colonias con servicio mejorado
Instalación por concepto de tomas de agua potable	491	600	81.83%	Tomas instaladas
Mantenimientos en sistemas de cloración de agua potable	84	56	150%	Sistemas de cloración atendidos.





Comparativo Cierre 2021 versus Cierre 2022 para los parámetros de
continuidad y presión
Medidas en punto crítico

Continuidad

Parámetro (horas de servicio)	Cierre 2021	Cierre 2022
[0 - 6)	27	19
[6 - 12)	206	88
[12 - 18)	65	166
[18 - 24)	24	37
24	48	64

Presión

Parámetro (kg/cm ²)	Cierre 2021	Cierre 2022
[0 - 0.3)	20	16
[0.3 - 0.5)	79	40
[0.5 - 0.75)	66	63
[0.75 - 1)	76	64
P > 1	129	191

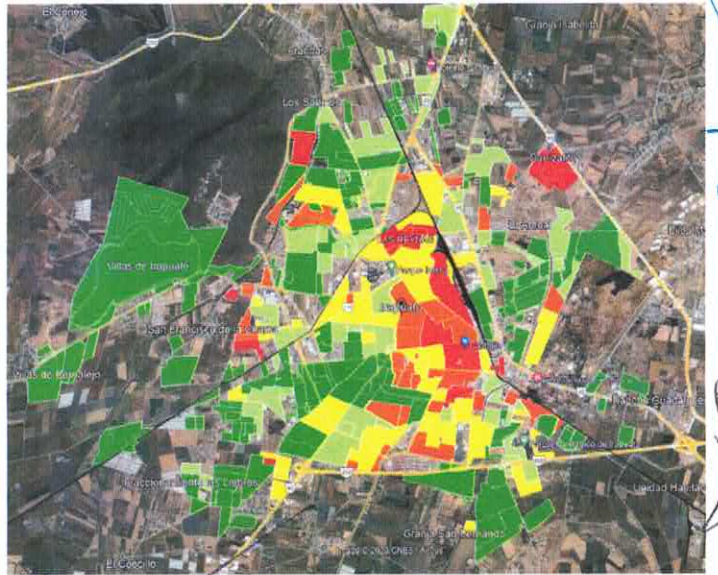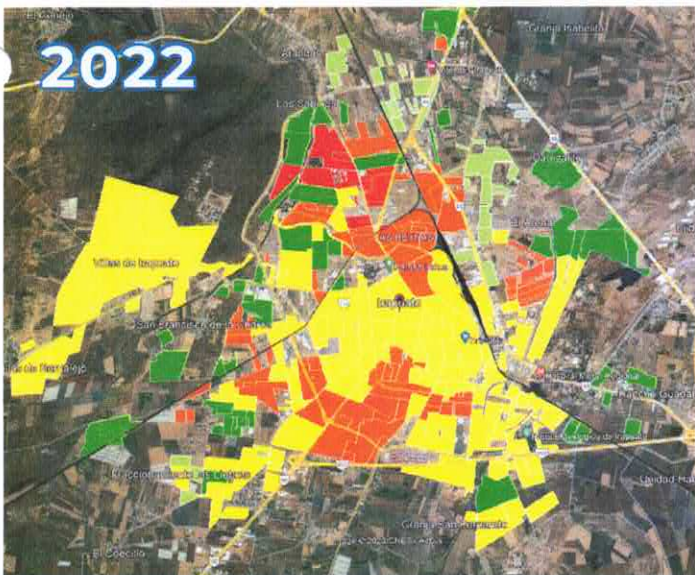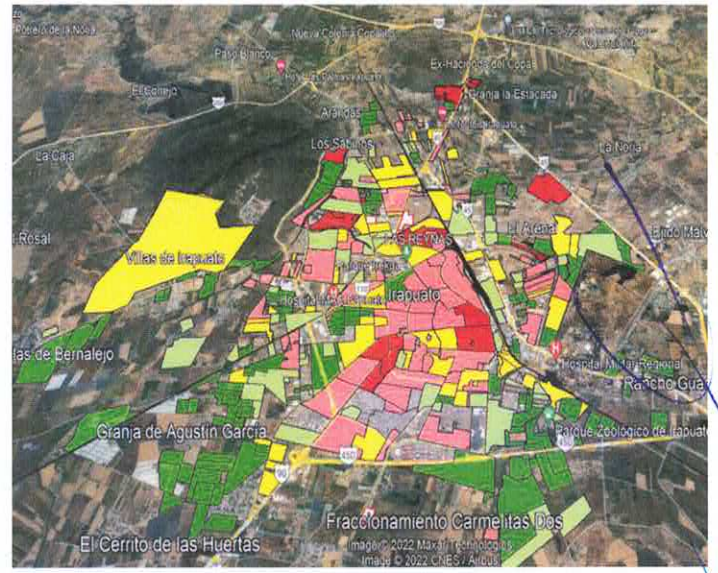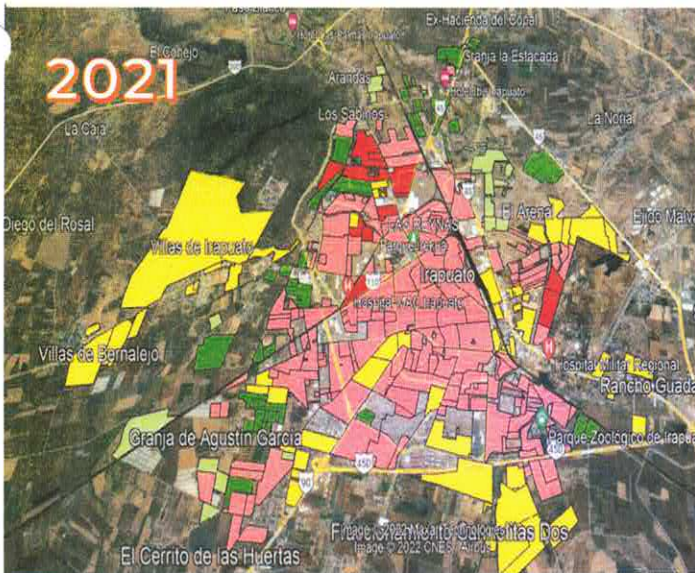



2.3.2 Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial prestados de forma eficaz.	Número de horas de desalojo en puntos de encharcamiento	3 horas	3 horas	Duración máxima del encharcamiento
	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	97.67%	95%	Folios recibidos/ Folios atendidos

Relativo a los indicadores de cumplimiento del componente de drenaje, en promedio se alcanzó un 101.40%, no habiéndose registrado encharcamientos con una duración mayor a tres horas, ni un alto número de quejas por servicios de drenaje.

Entregables operativos del componente DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño	
Número de folios atendidos de limpieza de drenaje	6,112	6,258	97.67%	Folios atendidos
Limpieza y desazolve de canales	23.63	12	196.92%	Kilómetros atendidos
Limpieza y desazolve de ríos	17.77	30	59.23%	Kilómetros atendidos
Limpieza y desazolve de líneas generales.	39,550	80,000	49.44%	Metros lineales desazolvados
Revisión de descargas sanitarias	6,283	9,500	66.14%	Descargas revisadas
Conservación y mantenimiento de líneas generales.	440	620	70.97%	Metros de líneas actualizadas

El desempeño promedio de las metas relativas al cumplimiento de entregables del componente asociado a la Subgerencia de drenaje y alcantarillado fue del 90.06%



2.3.3 Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicios de verificación de calidad de agua y tratamiento de aguas residuales proporcionados conforme a las regulaciones técnicas de observancia obligatoria.	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta de la calidad de agua	81.02%	100%	Análisis en PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domésticos realizados/ Programados
	Mantenimiento preventivo de equipos, e instalaciones relacionadas con el funcionamiento de las PTAR	100.00%	100%	Mantenimientos preventivos realizados/ Programado

En promedio el cumplimiento de indicadores de la Subgerencia de calidad de agua y PTAR fue del 90.5% en el componente de saneamiento. En cuanto a las metas asociadas a entregables, el promedio de desempeño fue del 88.55%, a continuación, se presentan los resultados.

Entregables operativos del componente SANEAMIENTO					
Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño		
Muestras realizadas (PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domésticos)	1,575	2,014	78.20%	Muestras realizadas	
Análisis realizados (PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domésticos)	23,767	29,336	81.02%	Análisis realizados	
Volúmenes de agua saneados	34,344,990	36,160,231	94.98%	Metros cúbicos	
Mantenimientos preventivos de equipos, e instalaciones relacionadas con el funcionamiento de las PTAR	4,620	4,620	100%	Mantenimientos ejecutados	



2.3.4 Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.

Para el componente asociado a la Gerencia de Comercialización, al cierre del ejercicio 2022, se obtuvo un cumplimiento promedio 84% en los indicadores respecto de las metas propuestas. Teniendo el mejor desempeño la eficiencia comercial y el padrón de usuarios.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera.	Eficiencia Comercial	58.27%	55%	Importes cobrados/ Importes facturados por servicio de agua potable
	Actualización del padrón de usuarios	3,488	2,523	Usuarios actualizados en el padrón
	Recuperación de cartera vencida	1.45%	5%	Importes cobrados respecto de la cartera vencida
	Porcentaje de incremento en micromedición	8.46%	10%	Medidores instalados respecto de totalidad de cuentas

En general el cumplimiento de metas relativo a entregables de la Gerencia tuvo un desempeño mejor a lo planeado, con un promedio de 115%.

En particular las actividades de contratación de servicios básicos, actualización de cuentas en giros y tarifas, convenios para la recuperación de la cartera vencida, y suspensión o restricción de los servicios por adeudos, se cumplieron las metas por encima del 100% y para el caso de suspensión de tomas clandestinas, se realizó más del 200% de lo programado. Solo la meta de recuperación de cartera vencida tuvo un desempeño por debajo de lo aceptable.



Entregables operativos del componente ATENCIÓN A USUARIOS				
Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño	
Importe facturado por servicio de agua potable	\$357.67	\$360.00	99.35%	Millones de pesos
Volumen facturado	19,318,819	18,460,356	104.65%	Metros cúbicos
Importe recuperado por cartera vencida	\$0.75	\$3.00	24.97%	Millones de pesos
Micromedidores remplazados	11,802	12,000	98.35%	Micromedidor es remplazados
Contratación de servicios básicos	2,048	1,845	111.00%	Cuentas contratadas
Actualización de cuentas en giros y tarifas.	1,440	901	159.82%	Cuentas actualizadas
Convenios para la recuperación de la cartera vencida	7,161	6,770	105.78%	Convenios realizados
Suspensión o restricción de los servicios por adeudos	96,046	83,600	114.89%	Cortes de servicio
Suspensión de tomas clandestinas.	1,104	510	216.47%	Cortes definitivos

Tabla 2. Registros de cuentas por tipo de usuario y giro del servicio.

Tipo de servicio	Domésticas	Mixtas	Públicas	Comerciales	Industriales	Totales
Agua	4,463	119	26	97	11	4,716
Agua y Drenaje	1,612	96	7	73	28	1,816
Agua, Drenaje y Tratamiento	116,749	7,759	267	7,743	516	133,034
Drenaje	82	0	0	6	4	92
Drenaje y Tratamiento	1,842	65	5	139	19	2,070
Totales	124,748	8,039	305	8,058	578	141,728



2.3.5 Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación de los mismos al Operador	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	50%	100%	Comunidades rurales atendidas/ Comunidades que presentan solicitud de atención
	Porcentaje de actividades de atención en comunidades realizadas	100%	100%	Acciones comunitarias realizadas/ Solicitudes de atención recibidas

Respecto de las actividades realizadas por la Gerencia de atención a comunidades rurales se atendió a 65 localidades rurales, para las cuales el Censo Nacional de Población y Vivienda (INEGI, 2020) tiene registrada una población de 95,099 habitantes. Asimismo, se trabajó en las zonas conurbadas como Camino Real de lo de Juárez, La Candelaria, Purísima de las Flores, Purísima del Jardín, Zapote el Milagro, Ex Hacienda de Márquez, Rancho Guadalupe y Taretan.

Entregables operativos del componente COMUNIDADES RURALES				
Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño	
Localidades rurales atendidas	65	130	50%	Localidades atendidas
Acciones de socialización en comunidades rurales	195	130	150%	Gestión social realizada
Diagnóstico de comunidades rurales susceptibles de incorporar	4	130	3.08%	Diagnósticos realizados
Caracterización de servicios e infraestructura por comunidad	11	130	8.46%	Informes realizados
Conformación y registro de comités de agua rurales	12	130	9.23%	Comités registrados
Atención, respuesta y seguimiento a solicitudes de comunidades rurales	190	190	100%	Solicitudes gestionadas



En cuanto a la conformación de comités se atendió a las localidades rurales de San Agustín de los Tordos, Comedero Grande, Guadalupe Villa Cárdenas, Laguna Larga, Loma de Juárez, Munguía, San Cristóbal, La Sanabria, Venado de San Lorenzo, así como a las zonas conurbadas conocidas como Camino Real lo de Juárez, Ex Hacienda de Márquez y La Candelaria.

LOCALIDADES ATENDIDAS

65

Localidades reconocidas CENSO INEGI 2020

HABITANTES BENEFICIADOS

95,099

Habitantes según CENSO INEGI 2020

PRINCIPALES ACCIONES

- Obra de rehabilitación vaso de captación pluvial en Tamahula
- Obra de rehabilitación vaso de captación pluvial en El Garbanzo
- 45** jornadas de DESAZOLVE a líneas de drenaje con equipo hidroneumático
- 32** acciones de GESTIÓN de incorporación y apoyo técnico
- 6** acciones de CAPACITACIÓN para uso de sistema de cloración

El tamaño de las esferas corresponde al volumen de población de la localidad intervenida



japami
el agua nos une

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



2.3.6 Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador

Resumen Narrativo	Indicador de componente	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Administración y gestión de servicios públicos proporcionados por el Organismo Operador	Cumplimiento de metas institucionales	46%	100%	Metas alcanzadas/ Metas programadas
Indicadores operativos por unidad responsable				
U Responsable	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Órgano Interno de Control	Porcentaje de auditorías realizadas	62%	100%	Auditorías realizadas/ Auditorias programadas
Unidad de Transparencia	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	76%	100%	Solicitudes respondidas en tiempo/ Solicitudes recibidas
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	22%	70%	Obras terminadas/ Obras programadas
Gerencia de Finanzas y Administración	Autonomía financiera del Organismo Operador	82.06%	85%	Ingresos propios/Ingresos totales
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras - Cuenta Pública	100%	100%	Obligación financiera cumplida/ Obligaciones requeridas
Coordinación Jurídica	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y convenios firmados	88.10%	100%	Contratos-convenios realizados/ Contratos-convenios susceptibles de ser suscritos
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo en forma	100%	100%	Seguimiento Integrado/ Seguimiento programado
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y publicación de productos informativos referentes a los servicios JAPAMI	478.24%	100%	Productos informativos realizados/ Productos informativos programados



Entregables operativos del componente de GESTIÓN

UR	Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño		
Dirección General	Comités y comisiones celebrados	64	50	128.00%	Sesiones realizadas	
	Sesiones de Consejo realizadas	16	12	133.33%	Sesiones realizadas	
Órgano Interno de Control	Auditorías realizadas	8	10	80.00%	Auditorías ejecutadas	
	Revisiones de procesos realizadas	1	5	20.00%	Revisiones realizadas	
Unidad de Transparencia	Actualización de obligaciones de transparencia	4	4	100.00%	Portal actualizado	
	Solicitudes de acceso a la información atendidas	54	71	76.06%	Repuestas emitidas	
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Programa de obra actualizado	3	4	75.00%	Programa actualizado	
	Expedientes técnicos validados	132	103	128.16%	Expedientes validados	
	Obras públicas en ejecución	76	74	102.70%	Obras contratadas	
	Dictamen técnico de factibilidades de servicios	111	115	96.52%	Dictámenes realizados	
	Gasto corriente	342.44	442.88	77.32%	Millones de pesos	
	Procesos de Adquisiciones, Arrendamiento y de Servicios	69	66	104.55%	Acciones realizadas	
	Cierre de ejercicio fiscal integrado	1	1	100.00%	Cierre fiscal integrado	
	Cuenta pública integrada por periodo	4	4	100.00%	Cuenta pública informada	
	Gestión de Inventarios	60%	100%	60.00%	Avance de programa	
	Soporte Técnico	287	250	114.80%	Acciones de soporte técnico realizadas	
	Funcionarios públicos capacitados	254	100	254.00%	Personas capacitadas	
	Coordinación Jurídica	Contratos realizados	185	210	88.10%	Contratos concluidos
		Dictamen legal de factibilidades de servicios	56	50	112.00%	Factibilidades revisadas
Inmuebles regularizados		3	7	42.86%	Inmuebles	



Entregables operativos del componente de GESTIÓN

UR	Concepto	Resultado del periodo	Programado	Desempeño	
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Seguimiento de metas institucionales	12	12	100.00%	Reporte integrado
	Actualización de software	10	12	83.33%	Implementaciones y/o actualizaciones ejecutadas
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Productos informativos difundidos	1,626	340	478.24%	Material multimedia, comunicados, spots, publicación en redes sociales
	Desarrollo de Programa de valores y cultura en torno al uso y reutilización del agua		1	0.00%	Programa desarrollado

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and several smaller marks]



3 Reportes ciudadanos. Comparativo cierre anual.



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page.]

4 Evolución de eficiencia física y comercial.



Gráfico 3. Comparativo mensual, eficiencia comercial.

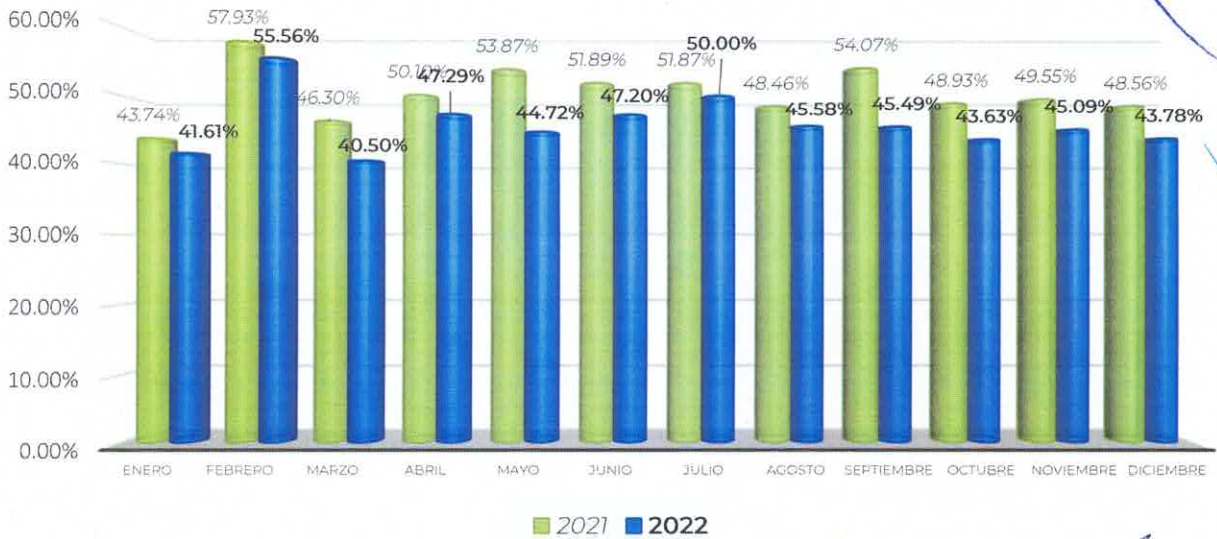


Gráfico 4. Comparativo mensual, eficiencia física.

5 Gestión de Programa obra y proyectos 2022.

Al cierre del ejercicio 2022 se tenía por contratado el programa obra por un importe de 269.76 millones de pesos. De los cuales 183.30 se tiene una previsión de recursos propios y 86.45 millones de fondos concurrentes, municipales, estatales y federales.

Tabla 4. Programa de inversión por zona de influencia y origen de recursos.

LOCALIDAD	TIPO	#	Importe contratado	Recursos propios	Municipal (FAISM-R33)	FAIS Estatal	PROAGUA	PRODDER *
CABECERA MUNICIPAL	AGUA	33	96,034,815	36,808,812	24,428,547	18,644,906	2,160,893	13,991,658
	ALCANTARILLADO	11	32,071,886	31,325,741				746,145
	CATASTRO AGUA Y DRENAJE	1	63,674,174	63,674,174				
	DRENAJE	6	16,614,202	12,834,673	1,799,307			1,980,222
	EFICIENCIA	6	31,368,170	30,680,799			687,372	
	SANEAMIENTO	4	2,107,695	2,107,695				
Total, CABECERA MUNICIPAL		61	241,870,943	177,431,894	26,227,854	18,644,906	2,848,264	16,718,025
RURAL	AGUA	8	12,967,827	3,596,618	7,875,120	998,483		497,605
	DRENAJE	6	14,623,635	1,980,041	10,661,652	1,981,942		
	SANEAMIENTO	1	300,000	300,000				
Total, RURAL		15	27,891,461	5,876,659	18,536,772	2,980,425		497,605
Total, GENERAL		76	269,762,405	183,308,553	44,764,627	21,625,331	2,848,264	17,215,630


En complemento al informe de obra y respecto de recurso PRODDER 2022, el depósito de devolución por derechos de extracción se recibió al finalizar el ejercicio 2022 por un monto total de \$24,118,103. Las acciones que se plasman a detalle en el Anexo B con financiamiento en esa fuente corresponden a las registradas en CONAGUA por un monto de hasta \$17,215,630. Adicional se tiene previsto un importe de \$5,739,999 para apoyo a consumo eléctrico teniendo un posible reintegro de \$1,162,474.00.

Se indica sin embargo que estos montos son una proyección susceptible de cambios conforme a la autorización del Programa de Acciones PRODDER 2022 de parte de la CONAGUA. A la fecha del corte que se informa aún está pendiente.

Paralelo al desarrollo de obra se contrataron proyectos por un importe de 13.75 millones de pesos para respaldar el desarrollo de obra en años subsiguientes, todos contratados con financiados con recursos propios del Organismo Operador.

Tabla 5. Programa de inversión en proyectos 2022.

LOCALIDAD	TIPO	#	Recurso propio contratado
CABECERA MUNICIPAL	AGUA	7	5,527,284
	ALCANTARILLADO	10	6,393,386
	DRENAJE	1	60,552
	SANEAMIENTO	1	398,835
Total, CABECERA MUNICIPAL		19	12,380,057
RURAL	AGUA	2	357,013
	SANEAMIENTO	1	998,790
Total, RURAL		3	1,355,804
Total, GENERAL		22	13,735,861




6 Gestión de Adquisiciones.

Tabla 6. Bienes adquiridos en el periodo que se reporta.

Alcance	Recurso aplicado	Fecha de contrato
Adquisición de vehículo para el uso común de las diferentes áreas	599,000	24-oct-22
Adquisición de vehículos para la Gerencia Comercial y atender las diferentes necesidades de los usuarios	3,213,000	07-nov-22
Adquisición de equipo dual hidroneumático especializado para desazolve, para el desazolve de líneas de drenaje sanitario y pluvial, así como atención de emergencias durante la temporada de lluvias	17,125,080	14-nov-22
Adquisición de variadores de frecuencia para la instalación en fuentes de abastecimiento	1,728,626	10-nov-22
Adquisición de consola de operador para el monitoreo de las fuentes de abastecimiento	1,299,038	10-nov-22
Adquisición de dataloggers para la instalación en fuentes de abastecimiento	987,930	10-nov-22
Adquisición de vehículo para el uso común de las diferentes áreas	599,000	17-nov-22
Adquisición de maquinaria ligera para el uso común de las diferentes áreas	1,802,425	01-dic-22
Adquisición de equipo de bombeo pluvial para el cárcamo 14,19,28,37 y la PTAR Pueblo Nuevo	2,278,378	14-dic-22
Adquisición de vehículos para la Gerencia Comercial y la Gerencia de atención a Comunidades	1,052,700	29-dic-22
Total, GENERAL		30,685,178

7 Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.

Tabla 7. Instrumentos celebrados en el periodo que se reporta.

NÚMERO	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATO DE ADQUISICIONES	
JAPAMI/ADQ/2022-21	Adquisición de material eléctrico.
JAPAMI/ADQ/2022-27	Adquisición de equipo de cómputo.
JAPAMI/ADQ/2022-28	Adquisición de cemento.
JAPAMI/ADQ/2022-29	Adquisición de camioneta doble cabina.
JAPAMI/ADQ/2022-30	Adquisición de vehículos de mantenimiento.
JAPAMI/ADQ/2022-31	Adquisición de equipo dual hidroneumático.
JAPAMI/ADQ/2022-32	Adquisición de variadores de frecuencia.
JAPAMI/ADQ/2022-33	Adquisición de consola de operador.
JAPAMI/ADQ/2022-34	Adquisición de dataloggers.
JAPAMI/ADQ/2022-35	Adquisición de camioneta doble cabina.
JAPAMI/CONV-PAGO-INTROD-AGUA Y DRENAJE-2022-01	Convenio de Pago
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
JAPAMI/PRESTSERV/2022-35	Paquete publicitario JAPAMI 2022 en programas radiofónico GRUPO ACIR, con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-37	Consultoría Administrativa y en Tecnologías de la información.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-42	Elaboración, Integración, tramitación, presentación y seguimiento de las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado ante el SAT por los siguientes periodos: agosto 2021, diciembre 2021, marzo, mayo y junio del 2022.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-43	Administrar en el régimen de incorporación fiscal a las personas encargadas de las diferentes máquinas expendedoras de agua (potabilizadoras) que tiene JAPAMI en diversos puntos del Municipio.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-44	Conformación de la evaluación al desempeño del programa: Agua y Saneamiento del Organismo Operador.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-46	Revisión de títulos de concesión y/o asignación otorgados por CONAGUA.
CONTRATOS DE SERVICIOS	
JAPAMI/SERV/2022-20	Mantenimiento correctivo a camión hidroneumático de la marca Sterling modelo 2001, serie 2FZHATAK52AJ81253 y número económico U-0206.
JAPAMI/SERV/2022-22	Servicio de banque para evento de fin de año para los trabajadores de JAPAMI.
JAPAMI/SERV/2022-23	Contratar el servicio para desarrollar una APP para que los usuarios puedan pagar los importes establecidos en sus recibos de pago, desarrollada en lenguaje multiplataforma de programación de amplia utilización en las aplicaciones web y desarrollo de software, de código abierto, compatible con iOS y Android.
CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2022-01	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En el Fracc. C.D. Deportiva (1era. Etapa).
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2022-02	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En el Fracc. Jardines del Valle (1era. Etapa).
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2022-03	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En el Fracc. La Hacienda (1era. Etapa).
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2022-07	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Colonia San Gabriel 1era. Sección, 1ra. Etapa.

NÚMERO	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/LS/FAISM/2022-02	Construcción de red de drenaje sanitario en las calles Pedregal, La Lomita, Del Canal, Antonio García, Av. Del Trabajo y Priv. Sin Nombre en la Localidad de Ex Hacienda de Márquez.
JAPAMI/LS/RP/OP/2022-04	Suministro e Instalación de Micromedidores para cambio de cuota fija a servicio medido 2022.
JAPAMI/LPN/PRODDER/2022-01	Construcción de línea de conducción del pozo No. 50 al tanque panorama.
JAPAMI/LP/PROAGUA/2022-02	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Colonia Las Rosas (etapa 1 de 3).
JAPAMI/LP/PROAGUA/2022-03	Rehabilitación de red entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En el Fraccionamiento La Estancia.
JAPAMI/LS/PSBMC-FAISM/2022-01	Ampliación de drenaje sanitario en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Localidad de Tinaja de Bernaldes (etapa tres de tres).
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-15	Obras de seguridad e higiene.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-16	Actualización del estudio de Diagnóstico de tanques de regulación.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-17	Instalación eléctrica laboratorio para planta salida a Pueblo Nuevo segunda etapa.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-18	Alumbrado a las fuentes de abastecimiento, rebombes y tanques (1er etapa).
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-19	Video inspección y rehabilitación del ademe del pozo 71.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-26	Adecuación de instalaciones del pozo 119 (cumplimiento con norma).
JAPAMI/AD/PRODDER/2022-01	Rehabilitación de la línea de distribución de la calle Veracruz Col. San Pedro (2da etapa).
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2022-01	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Colonia Campestre Hurtado (Colonia San Gabriel 2da Sección) 2da etapa.
JAPAMI/AD/PROAGUA/2022-01	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Colonia Santa María, en las calles Roberto Sánchez y Santa Elena.
JAPAMI/AD/FAISM/2022-01	Ampliación de la red de agua potable en las calles: Emiliano Zapata, Bella Vista, Muñiz, Pedregal, Av. Carretera, Juventino Rosas y Cuatro Calles sin nombre en la Localidad Santa Bárbara.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-05	Estudio de subsuelo para proyecto ejecutivo de construcción de red de drenaje pluvial Las Heras primera etapa.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-07	Proyecto ejecutivo para el equipamiento y rehabilitación de pozo profundo No. 78 de Quinta Las Villas, incluye video inspección y aforo.
JAPAMI/LPN/RP/2022-01	Suministro e Instalación de Micromedidores para cambio 2022.
JAPAMI/LPN/RP/2022-02	Sistematización de lectura de miromedidores en tomas e incorporación de lecturas al sistema de facturación y cobranza (1er etapa).
CONTRATO DE COMODATO	
JAPAMI/COM/2022-16	Gastos de consumo de combustible y mantenimiento vehicular junio - diciembre 2022
CONTRATO DE ENAJENACIÓN	
JAPAMI/ENAJ/2022-01	JAPAMI vende y el adquirente compra en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, las partidas 1 y 2 de la subasta pública No. JAPAMI 01/2022 para la "Enajenación de 13 motocicletas, 1 cuatrimoto, 12 camionetas, 2 camionetas pipa y 1 camión tolva, dando un total de 29 vehículos en desuso.

NÚMERO	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-04	Actualización del manual de normas y lineamientos técnicos de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y estructuras inherentes a estos sistemas (tanques elevados y elementos de plantas de tratamiento) de JAPAMI.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-05	Otorgar el servicio consistente en el abastecimiento de combustible a los vehículos y equipos propiedad de JAPAMI, en la estación ubicada en Blvd. Mariano J. García 1310, Irapuato, Guanajuato.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-06	Otorgar el servicio consistente en el abastecimiento de combustible a los vehículos y equipos propiedad de JAPAMI, en la estación ubicada en: Avenida Efraín González Luna número 8805, Colonia Ejido Lo de Juárez.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-07	Otorgar el servicio consistente en abastecimiento de combustible a los vehículos y equipos propiedad de JAPAMI, en la estación ubicada en: Casimiro Liceaga número 1450, Colonia Los Presidentes.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-08	Otorgar el servicio consistente en el abastecimiento de combustible a los vehículos y equipos propiedad de JAPAMI, en la estación ubicada en: Avenida Arandas número 2142, Colonia Ejido Lo de Juárez.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	
PMI-JAPAMI-PSBGTO-01/2022	Especificar las condiciones para la aplicación y transferencia de recursos, para que JAPAMI directamente o a través de terceros lleve a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras insertas en los anexos de ejecución de El PROGRAMA, que se deriven del convenio SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022.
PMI/JAPAMI/001/FAISM/Comisión Rural/2022	Establecer las bases para la transferencia de recursos de las obras autorizadas en la comisión de trabajo Desarrollo Rural, rubros Agua Potable y Drenaje, Alcantarillado y Letrina del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), Ramo 33 ejercicio fiscal 2022.
PMI/JAPAMI/001/FAISM/Comisión Agua Potable/2022	Establecer las bases para la transferencia de recursos de las obras autorizadas en la Comisión de Trabajo Agua Potable y Alcantarillado, Rubro Agua Potable, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), Ramo 33 ejercicio fiscal 2022.
PMI/JAPAMI-PSBMC-01/2022	Especificar las condiciones para la aplicación y transferencia de recursos, para que JAPAMI directamente o a través de terceros lleve a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras insertas en los anexos de ejecución de, que se deriven del convenio SEDESHU-GTO-PSBMC-17/2022.

8 Factibilidades.

Tabla 8. Solicitud de factibilidades atendidas.

Fecha de Comité	Interesado	Elemento solicitado	Objeto	Resultado de valoración	Agua	Drenaje	Alcantarillado
17-nov	Comebi de México, S.A. de C.V.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	1,430 viviendas, tipo Interés Social, 69 locales comerciales, 14 áreas para casetas y servicios.	Factibilidad del servicio drenaje sanitario, en relación al agua potable, deberá de contar con fuentes de abastecimiento; con respecto al drenaje pluvial, no se cuenta con infraestructura, por lo que deberá descargar a un cuerpo receptor.	No	Sí	No
17-nov	Yupashop, S.A. de C.V.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	258 viviendas, tipo Residencial, superficie comercial 4,500 metros cuadrados.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Sí	Sí	Sí
17-nov	Ma. Luisa Villagómez Rosiles	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	24 viviendas de tipo interés social.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Sí	Sí	Sí
17-nov	Asociación de Colonos 24 de diciembre de Irapuato, A.C.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	98 viviendas de tipo popular.	Factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador. con respecto a drenaje pluvial, no se cuenta con infraestructura, deberá descargar a un cuerpo receptor.	Sí	Sí	No

Fecha de Comité	Interesado	Elemento solicitado	Objeto	Resultado de valoración	Agua	Drenaje	Alcantarillado
17-nov	Inmobiliaria Jardines del Campestre, S.A. de C.V. (Trento)	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	262 viviendas de tipo Residencial.	Factibilidad del servicio de drenaje sanitario, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador. con respecto al agua potable, deberá de contar con las fuentes de abastecimiento necesarias, en relación al drenaje pluvial, no se cuenta con infraestructura, deberá descargar a un cuerpo receptor.	No	Si	No
17-nov	Inmobiliaria Jardines del Campestre, S.A. de C.V. (Piamonte)	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	260 viviendas de tipo Residencial	Factibilidad del servicio de drenaje sanitario, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador. con respecto al agua potable, deberá de contar con las fuentes de abastecimiento necesarias, en relación al drenaje pluvial, no se cuenta con infraestructura, deberá descargar a un cuerpo receptor.	No	Si	No
17-nov	Activivienda, S.A. de C.V.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	76 viviendas de tipo Interés Social.	Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje sanitario, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador. con respecto al drenaje pluvial, no se cuenta con infraestructura, deberá descargar al canal de riego.	Si	Si	No
17-nov	Masada Arquitectos Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Los aguacates)	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	504 viviendas de tipo Residencial.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Si	Si	Si
17-nov	Masada Arquitectos Inmobiliaria, S.A. de C.V. (El Lago)	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	124 viviendas de tipo Residencial.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Si	Si	Si

Fecha de Comité	Interesado	Elemento solicitado	Objeto	Resultado de valoración	Agua	Drenaje	Alcantarillado
17-nov	Inmobiliaria JMVA, S.A. de C.V.	Reconsideración de los puntos de conexión de drenaje sanitario y drenaje pluvial, otorgados mediante la Factibilidad No. 022-2022	444 viviendas, tipo Interés Social.	Se ratificó lo señalado en la factibilidad entregada inicialmente, en relación al drenaje sanitario, con respecto al drenaje pluvial no cuenta con infraestructura, por lo que deberá realizar el proyecto y la construcción de un tanque tormenta al interior.	-	Si	No
17-nov	Desarrollos Sierra Vista, S.A. de C.V.	Reconsideración de punto de conexión de agua potable.	958 viviendas, de tipo Residencial.	Desarrollador realizará propuestas viables para el suministro de agua potable, atendiendo a la normativa vigente.	Si	-	-
20-dic	Inmobiliaria y Constructora OP, S.A. de C.V., y los C.C. Juan José Salas León y Omar Méndez Martínez	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	70 viviendas, de tipo Interés Social, superficie comercial 317.58 metros cuadrados.	Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje sanitario, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador. con respecto al drenaje pluvial, no se cuenta con infraestructura, deberá descargar a un cuerpo receptor.	Si	Si	No
20-dic	Coalición Ciudadana de Irapuato, A.C.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	234 viviendas de tipo Interés Social, superficie comercial 2,520 metros cuadrados.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Si	Si	Si
20-dic	Desarrollos Casi ve, S.A. de C.V.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	220 viviendas de tipo Interés Social.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Si	Si	Si

Fecha de Comité	Interesado	Elemento solicitado	Objeto	Resultado de valoración	Agua	Drenaje	Alcantarillado
20-dic	Paulo Azis Ramirez Urbina	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	363 viviendas de tipo residencial.	Pendiente, toda vez que se revisarán los antecedentes del predio.	No	No	No
20-dic	Dinámica del Hábitat, S.A. de C.V.	Actualización de la Factibilidad No. FACT-011/2022, respecto al número de viviendas y superficie comercial.	144 viviendas de tipo Interés Social, superficie comercial de 453.55 metros cuadrados.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Si	Si	Si
20-dic	Grupo México, S.A. de C.V.	Actualización de la Factibilidad No. FACT-005/2022, respecto al número de viviendas y superficie comercial.	18 viviendas de tipo Residencial, superficie comercial 4,209.95 metros cuadrados.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador.	Si	Si	Si
20-dic	Desarrollos Sierra Vista, S.A. de C.V.	Reconsideración del punto de conexión del drenaje sanitario y drenaje pluvial.	958 viviendas, de tipo Residencial.	Factibilidad del servicio de drenaje sanitario, con respecto al drenaje pluvial, no cuenta con la infraestructura, por lo que el desalojo se recomienda que sea a gravedad por rasantes.	-	Si	No
20-dic	Promotora Hípica del Centro, S.A. de C.V.	Factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	10 viviendas, de tipo Residencial.	Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje sanitario, se condicionó a ejecutar acciones de acuerdo a lo solicitado por el fraccionador; con respecto al drenaje pluvial, no cuenta con la infraestructura, por lo que deberá considerarse que descargue por rasantes hasta el canal.	Si	Si	No

9 Comunicación Social.

Al cierre de la anualidad, la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación informa que en la construcción de una mejor percepción del Organismo se realizaron las siguientes acciones.

- EXPO ANEAS 2022. Participación en las actividades de organización y gestión municipal para la realización de la misma. Además de la presencia de JAPAMI con un stand con actividades que promovieron el cuidado del agua.
- Se dio inicio al proyecto de cambio de imagen física e institucional y posicionamiento nuevo logo JAPAMI.
- Se trabajó en una encuesta de percepción y se cuenta con resultados de percepción de la JAPAMI, para detonar acciones focalizadas de atención hacia la ciudadanía.
- Se mejoró el rendimiento y mejor aplicación de las redes sociales.
- Se cuenta con un plan anual de comunicación social y vinculación del organismo 2023, el cual contempla proyectos para cuidado el uso y rehúso del agua.
- Se desarrollaron contenidos audiovisuales para las distintas audiencias del Organismo.

10 Seguimiento a principales proyectos estratégicos.

Iniciativa	Avance	Alcance realizado
Balace de Agua – Cabecera Municipal	100%	Se implementó la metodología de balance de agua, se cuenta con un departamento y software especializado para realizar balances periódicos para la cabecera municipal. A la fecha se está estimando el balance al cierre del 2022.
Proyecto de sectorización - Cabecera Municipal	100%	Se cuenta con un proyecto de sectorización para las zonas de cobertura del Operador, se trabaja en la programación de obra para ejecutar dicho proyecto.
Mejora en la atención a reportes de falta de agua	99.82%	Disminuyó en 16.4% la cantidad de reportes por falta de agua. De los 15,272 recibidos se atendieron 15,245 en la misma anualidad.
Implementar la atención institucional a las comunidades rurales	100%	La gerencia de atención a comunidades rurales, atendió 65 localidades rurales y trabajó en conjunto con los asentamientos conocidos como Camino Real de lo de Juárez, La Candelaria, Purísima de las Flores, Purísima del Jardín, Zapote el Milagro, Ex Hacienda de Márquez, Rancho Guadalupe y Taretan.
Actualización de sistemas de desinfección de agua	150%	Se actualizaron sistemas de cloración en 84 fuentes de abastecimiento, el programa original contemplaba 56.
Certificación de sistemas de abastecimiento de agua	100%	Se certificaron los dos pozos propuestos antes las autoridades sanitarias, realizándose el muestreo y análisis de calidad del para el cumplimiento de la normativa aplicable en dos periodos distintos.
Programa de calidad de agua	100%	
Programa de mejora del servicio de agua potable	112%	Se mejoro el servicio (presión y continuidad) en 127 colonias, la propuesta original contemplaba 113.
Limpieza y desazolve de ríos	59%	Durante la anualidad se presentaron inconvenientes con uno de las retroexcavadoras, por reparación, por lo tanto, no fue posible dar salida a la totalidad del programa.
Limpieza y desazolve de canales	197%	Fueron atendidos 23.63 kilómetros en cuanto a limpieza de ríos, acción que se complementa con los trabajos realizados por obras públicas.
Iniciar gestiones para la construcción de NUEVA PTAR Salida a Pueblo Nuevo (Factibilidades)	15%	El 11 de noviembre de 2022 se enviaron los formatos correspondientes al Apoyo Financiero al Fondo para el financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura -FEPI-, solicitando financiamiento para la realización de proyectos de ingeniería y estudio de mercado de agua residual.
Mejoramiento de las condiciones de operación en cárcamos	100%	Al cierre del ejercicio no se registraron puntos de encharcamiento con una duración mayor a 3 horas en la ciudad.
Catastros de agua, drenaje sanitario y pluvial	10%	Al cierre de la anualidad se tuvieron contratados 16 acciones para cubrir la totalidad del levantamiento del catastro en la ciudad.
Fortalecimiento en la atención a usuarios	100%	Los proyectos de fortalecimiento relacionados con atención de usuarios, es decir, instalación de cajeros, generación de manual de políticas comerciales, ampliación de horario de servicio y mejoras en el servicio de WhatsApp fueron implementadas en totalidad.

11 Anexos.

ANEXO A

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2022

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2022 4TA MODIF	CONCENTRADO		CONCENTRADO PAGADO
		AUTORIZADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	PAGADO	
131	SUELDOS BASE	32,497,069.13	310,833,116.32		30,702,524.20	30,702,524.20	30,702,524.20
132	SUELDOS DE CONFIANZA	54,584,364.50	53,961,937.45		52,383,033.90	52,383,033.90	52,383,033.90
1321	PRIMA VACACIONAL	2,385,784.70	2,495,200.03		2,393,874.29	2,393,874.29	2,393,874.29
1322	PRIMA DOMINICAL	300,000.00	429,057.56		240,451.58	240,451.58	240,451.58
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,020,295.74	30,704,933.35		9,480,519.03	9,480,519.03	9,480,519.03
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	150,000.00		66,716.11	66,716.11	66,716.11
1332	DIAS FESTIVOS	500,000.00	836,397.96		605,196.44	605,196.44	605,196.44
1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	50,000.00	340,229.52		324,536.54	324,536.54	324,536.54
1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,507,560.14	12,345,925.30		11,194,391.33	11,194,391.33	11,194,391.33
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,906,998.73	4,384,544.43		3,730,157.58	3,730,157.58	3,730,157.58
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,891,690.28	4,449,635.93		3,797,478.31	3,797,478.31	3,797,478.31
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000.00	200,000.00		180,252.19	180,252.19	180,252.19
1522	INDEMNIZACIONES	702,327.48	870,303.28		74,325.41	74,325.41	74,325.41
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	200,000.00		12,800.00	12,800.00	12,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES	700,000.00	155,152.65		149,200.71	149,200.71	149,200.71
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	1,498,282.12		-	-	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	125,501,090.70	125,501,090.70		116,678,257.62	116,678,257.62	116,677,508.76
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	320,027.26	570,862.90		355,600.49	355,600.49	355,600.49
2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	45,000.00		43,569.60	43,569.60	43,569.60
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	468,880.73	150,430.73		95,759.44	95,759.44	95,759.44
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	555,667.95	1,083,838.04		609,776.40	609,776.40	565,139.61
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	357,253.30	346,951.20		345,176.78	345,176.78	345,176.78
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	343,637.57	266,564.39		138,854.26	138,854.26	138,854.26
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,000.00	77,100.00		76,275.91	76,275.91	76,275.91
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,872.30	3,872.30		3,752.03	3,752.03	3,752.03
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	931,637.77	831,491.50		738,767.17	738,767.17	738,767.17
2421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	2,878,750.00	1,108,289.15		1,074,061.12	1,074,061.12	1,074,061.12
2431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	-	4,246.27		2,520.00	2,520.00	2,520.00
2441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	8,125.00	7,995.00		4,985.50	4,985.50	4,985.50
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,688,364.74	1,839,889.52		1,452,978.60	1,452,978.56	1,452,978.56
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,650,644.68	6,086,575.71		4,941,405.11	4,889,358.00	4,889,358.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,310,860.26	6,664,934.11		6,564,108.85	6,564,108.85	6,564,108.85
2491	MATERIALES DIVERSOS	94,301.40	228,901.94		209,505.20	209,505.20	209,505.20
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,072,226.87	2,698,720.03		191,594.87	191,594.87	191,594.87
2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	-	-		-	-	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00		40,031.04	40,031.04	40,031.04
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000.00	79,391.91		79,343.90	79,343.90	79,343.90
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,165.57	721,652.57		535,876.45	535,876.45	535,876.45
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,385,216.14	18,487,931.29		15,607,802.38	15,607,802.39	15,427,521.85
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,558,413.76	1,606,413.76		1,437,476.70	1,437,476.71	1,239,054.07
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	6,026,461.77	6,600,720.44		6,060,612.99	6,060,612.90	5,996,702.45
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,642,850.11	2,444,573.46		2,337,925.27	2,337,925.27	2,337,925.27

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'f' and 'B']

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2022		CONCENTRADO		CONCENTRADO	
		AUTORIZADO	4TA MODIF	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1497,729.23	1497,729.23	56,176.46	56,176.46	56,176.46	56,176.46	56,176.46	
2721	PENDAS DE SEGURIDAD	385,276.64	385,276.64	39,093.87	39,093.87	39,093.87	39,093.87	39,093.87	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,500.00	14,500.00	-	-	-	-	-	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	346,343.09	461,157.75	335,447.43	273,191.51	273,191.51	273,191.51	273,191.51	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,000.00	79,690.10	73,542.38	73,542.37	73,542.37	73,542.37	73,542.37	
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	6,622.11	8,577.89	5,497.98	5,497.98	5,497.98	5,497.98	5,497.98	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS D	90,500.00	595,532.81	283,604.47	283,604.47	283,604.47	283,604.47	283,604.47	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,106.13	1,250,620.31	1,200,820.46	1,200,820.43	1,200,820.43	1,200,820.43	1,200,820.43	
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	511,960.41	336,960.41	330,340.68	330,340.68	330,340.68	330,340.68	330,340.68	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,180,850,605	56,899,951,61	47,276,637.79	47,276,637.79	47,276,637.79	47,276,637.79	46,675,064.19	
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,758,752.22	108,326,159.85	87,669,710.82	87,669,710.82	87,669,710.82	87,669,710.82	87,669,710.82	
3121	SERVICIO DE GAS	1,200.00	1,200.00	1,199.99	1,199.99	1,199.99	1,199.99	1,199.99	
3131	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00	
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	380,000.00	406,370.02	405,933.08	405,933.08	405,933.08	405,933.08	405,933.08	
3151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	376,937.96	357,262.02	331,907.00	331,907.00	331,907.00	331,907.00	308,764.00	
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	49,750.00	66,387.54	66,387.54	66,387.54	66,387.54	66,387.54	66,387.54	
3181	SERVICIO POSTAL	7,972.21	7,972.21	2,865.94	2,753.94	2,753.94	2,753.94	2,753.94	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	582,049.46	395,929.46	395,929.46	395,929.46	395,929.46	395,929.46	
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,000.00	84,000.00	83,663.20	83,663.20	83,663.20	83,663.20	83,663.20	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,187,255.60	9,419,933.59	9,127,752.66	9,127,752.66	9,127,752.66	9,127,752.66	9,127,752.66	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	355,044.19	1,065,215.38	556,595.07	556,595.07	556,595.07	556,595.07	556,595.07	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	
3311	SERVICIOS LEGALES	1,744,551.78	2,202,473.94	1,290,866.37	1,290,866.37	1,290,866.37	1,290,866.37	1,271,127.81	
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	285,000.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	-	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	254,189.00	6,318,352.62	5,780,167.18	5,724,746.83	5,724,746.83	5,724,746.83	5,724,746.83	
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	-	3,368,460.00	3,358,026.00	3,358,026.00	3,358,026.00	3,358,026.00	3,358,026.00	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,154.87	137,212.74	98,793.02	98,793.02	98,793.02	98,793.02	98,793.02	
3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	310,188.88	1,063,454.42	588,108.49	588,108.49	588,108.49	588,108.49	544,364.43	
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	23,213.45	-	-	-	-	-	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257,632.86	13,307.55	-	-	-	-	-	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,032,646.57	14,663,283.26	10,512,020.43	8,167,926.55	8,167,926.55	8,167,926.55	7,973,272.98	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,083,000.00	1,333,000.00	1,263,824.22	1,263,824.22	1,263,824.22	1,263,824.22	1,263,824.22	
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	150,000.00	-	-	-	-	-	-	
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	785,000.00	926,000.00	893,430.40	893,430.40	893,430.40	893,430.40	893,430.40	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	997,113.61	1,227,406.17	806,854.88	806,854.88	806,854.88	806,854.88	806,854.88	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	993,498.54	1,346,780.03	1,249,378.00	1,249,378.00	1,249,378.00	1,249,378.00	1,249,378.00	
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,396,407.94	1,990,615.10	1,987,056.54	1,987,056.54	1,987,056.54	1,987,056.54	1,987,056.54	
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	5,000.00	15,000.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	6,149.00	
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	339,466.80	349,059.68	238,941.16	238,941.16	238,941.16	238,941.16	238,941.16	
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	31,782.54	140,818.08	1,289,544.19	1,289,544.19	1,289,544.19	1,289,544.19	1,052,923.86	
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMO	1,807,597.29	2,898,509.95	2,620,968.91	2,620,968.90	2,620,968.90	2,620,968.90	2,085,502.00	
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	7,223,290.89	11,542,063.11	10,271,250.49	10,271,250.49	10,271,250.49	10,271,250.49	9,712,908.88	
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,541,232.45	12,000,862.29	11,541,630.97	11,541,630.97	11,541,630.97	11,541,630.97	11,541,630.97	
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	105,000.00	132,732.00	132,732.00	132,732.00	132,732.00	132,732.00	132,732.00	
3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,282,397.38	2,851,568.38	2,413,547.77	2,413,547.75	2,413,547.75	2,413,547.75	2,413,547.75	
3651	SERVICIOS DE INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,000.00	100,000.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	16,936.00	
3711	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	12,000.00	92,000.00	315,738.85	315,738.85	315,738.85	315,738.85	315,738.85	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2022		CONCENTRADO		CONCENTRADO	
		AUTORIZADO	4TA MODIF	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO			
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	24,934.56	30,2734.52	21942.94	21942.94	21942.94	21942.94		
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIO	34,654.39	356,790.63	23159.124	23159.124	23159.124	23159.124		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE C	-	76,673.74	2,598.10	2,598.10	2,598.10	2,598.10		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	115,304.40	3,017,822.99	3,010,978.87	3,010,978.87	3,010,978.87	3,010,978.87		
3852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIC	73,550.80	73,550.80	51,756.00	51,756.00	51,756.00	51,756.00		
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	219,319,988.21	24,655,053.07	24,570,813.30	24,570,813.30	24,570,813.30	24,570,813.30		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	936,760.90	6,830,057.51	6,630,329.78	6,630,329.78	5,777,073.01	5,777,073.01		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000.00	23,726.00	21,868.83	21,868.83	21,868.83	21,868.83		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	7,900.00	6,083.60	6,083.60	6,083.60	6,083.60		
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1870,000.00	3,070,000.00	2,718,376.00	2,718,376.00	2,718,376.00	2,718,376.00		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1675,200.00	10,894,677.74	10,894,677.74	10,894,677.74	10,894,677.74	10,894,677.74		
3000	SERVICIOS GENERALES	133,884,843.95	213,172,845.65	184,142,917.03	181,736,330.78	179,043,000.198	179,043,000.198		
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA E	88,558.92	72,000.00	23,831.44	23,831.44	23,831.44	23,831.44		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,023.71	23,023.71	23,023.71	23,023.71	23,023.71	23,023.71		
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000,000.00	30,000.00	-	-	-	-		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,111,582.63	125,023.71	46,855.15	46,855.15	46,855.15	46,855.15		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1575,600.00	1930,864.47	1,879,572.26	1,879,572.26	1,879,572.26	1,879,572.26		
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	321,000.00	8,968,344.11	8,931,268.08	8,931,268.07	8,931,268.07	8,931,268.07		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	220,204.03	676,995.88	248,214.00	248,214.00	248,214.00	248,214.00		
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	151,520.00	76,720.00	76,720.00	76,720.00	76,720.00		
5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	-	54,748.52	54,748.52	54,748.52	54,748.52	54,748.52		
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,430,000.00	45,763,324.45	45,643,461.42	35,474,421.42	35,474,421.42	35,474,421.42		
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	400,000.00	200,520.79	-	-	-	-		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	220,000.00	40,164.183	40,164.181	40,164.180	40,164.180	40,164.180		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,450,000.00	77,166,050.73	74,417,143.02	74,417,143.02	74,417,143.02	74,417,143.02		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	2,318,550.00	2,318,550.00	2,318,550.00	2,318,550.00	2,318,550.00		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIA	172,000.00	227,602.58	225,517.26	225,517.26	225,517.26	225,517.26		
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	33,513.60	33,513.60	33,513.60	33,513.60	33,513.60		
5661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	-	-	-	-	-		
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	6,490,356.48	4,084,831.71	4,084,831.70	4,084,831.68	4,084,831.68		
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	940,000.00	3,395,391.01	3,330,681.25	2,103,032.93	2,103,032.93	2,103,032.93		
5691	OTROS EQUIPOS	1675,000.00	2,344,837.53	2,279,622.75	2,279,622.75	2,279,622.75	2,279,622.75		
5811	TERRENOS	4,747,297.64	-	-	-	-	-		
5891	INFRAESTRUCTURA	4,747,297.64	-	-	-	-	-		
5911	SOFTWARE	-	240,179.86	228,315.06	228,315.06	228,315.06	228,315.06		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,988,399.32	150,364,249.84	144,453,800.74	132,757,112.39	132,757,112.39	132,757,112.39		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	182,354,240.00	305,319,089.48	294,358,877.99	103,239,274.09	85,729,422.44	85,729,422.44		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,360,000.00	11,993,334.47	4,993,906.48	3,133,149.90	1,315,546.69	1,315,546.69		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCES	23,760,000.00	19,012,656.94	17,748,607.78	13,232,386.11	9,537,058.44	9,537,058.44		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	5,840,000.00	13,500,000.00	13,460,343.97	4,271,248.66	2,203,989.57	2,203,989.57		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	215,314,240.00	348,971,080.89	330,561,736.22	123,876,058.76	98,786,077.14	98,786,077.14		
7471	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUID	-	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	-	77,160,199.08	-	-	-	-		
7000	INVERSIÓN FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	-	227,160,109.08	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
8531	OTROS CONVENIOS	-	22,776.04	17,314.36	17,314.36	17,314.36	17,314.36		
8000	PARTICIPACIONES Y APOYACIONES	-	22,776.04	17,314.36	17,314.36	17,314.36	17,314.36		
TOTAL PRESUPUESTO 2022		54,360,162.65	1,121,911,271.52	972,877,518.91	752,326,290.75	723,353,354.95	723,353,354.95		


[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]


ANEXO B


PROGRAMA OBRA 2022 _ 3a Modificación


#	Descripción del objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	FAIS Estatal	PROAGUA	PRODDER*
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	AGUA	ACCIONES PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,139,835	6,139,835	-	-	-	-
				ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA179-SCFI-2018 (2022)	1,989,973	1,989,973	-	-	-	-
				ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE TANQUES DE REGULACIÓN	698,737	698,737	-	-	-	-
				ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL POZO 119 (CUMPLIMIENTO CON NORMA)	997,701	997,701	-	-	-	-
				ALUMBRADO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, REBOMBEO Y TANQUES (1ER ETAPA)	999,931	999,931	-	-	-	-
				AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA, MUÑIZ, PEDREGAL, AV. CARRETERA, JUVENTINO ROSAS Y CUATRO CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA.	2,734,665	2,734,665	-	2,734,665	-	-
				AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: GUADALUPE VICTORIA Y ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA III	998,500	998,500	-	998,500	-	-
				CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA	17,997,566	8,998,783	-	8,998,783	-	8,998,783
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXIÓN)	1,499,945	1,499,945	-	1,499,945	-	-
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS HERAS 3RA SECCIÓN	1,384,505	1,384,505	-	1,384,505	-	-
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA FE 2000	2,493,381	1,246,691	-	1,246,691	-	1,246,691
				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 67 DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	1,497,768	748,884	-	748,884	-	748,884
				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 78 DE QUINTA LAS VILLAS	999,939	499,970	-	499,970	-	499,969
				REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE VERACRUZ COL. SAN PEDRO (2DA ETAPA)	500,000	250,001	-	250,001	-	249,999
				REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. JARDINES DEL VALLE (1ER. ETAPA)	5,990,959	-	2,995,480	2,995,480	-	-
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. CD. DEPORTIVA (1ER. ETAPA)	5,991,108	-	2,995,554	2,995,554	-	-				
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA HACIENDA (1ER. ETAPA).	4,978,756	-	2,489,378	2,489,378	-	-				

#	Descripción del objetivo	Ambito	Servicio	Nom bre de la obra/acción	Im porte contratado	Recurso propio	Municipal (FAISM-R.33)	FAIS Estatal	PROAGUA	PRODDER*
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LAS TROJES (1ERA. ETAPA).	4,414,124.3	-	3,245,859	1,195,384	-	-
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA SANTA MARÍA EN LAS CALLES ROBERTO SÁNCHEZ Y SANTA ELENA.	1,264,712	758,827	-	-	505,885	-
				REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (COLONIA SAN GABRIEL 2DA SECCION), 2DA ETAPA.	2,907,548	-	1,453,774	1,453,774	-	-
				REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA SAN GABRIEL 1RA SECCION, 1RA ETAPA.	4,047,724	-	2,023,862	2,023,862	-	-
				REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COL. CAMPESTRE HURTADO. (1ER ETAPA).	4,996,492	-	2,498,246	2,498,246	-	-
				REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA CASA BLANCA Y COLONIA CD. DEPORTIVA, EN LAS CALLES JOAQUIN CAPILLA, RICARDO DELGADO, MARTÍN DIAZ Y DANIEL BAUTISTA.	5,986,457	-	2,993,229	2,993,229	-	-
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS. (ETAPA 1 DE 3)	2,985,181	1,791,109	-	-	1,194,072	-
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) CASA BLANCA	500,000	500,000	-	-	-	-
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) PARA LAS MARGARITAS	986,501	986,501	-	-	-	-
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)	1,497,822	1,497,822	-	-	-	-
				REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA.	1,152,339	691,403	-	-	460,936	-
				REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA	2,495,633	1,247,817	-	-	-	1,247,816
				REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE IRAPUATO	1,999,035	999,518	-	-	-	999,517
				SENSORES DE MONITOREO EN POZOS Y ACCIONES DE TELEMETRIA 2022	2,189,377	2,189,377	-	-	-	-
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON SISTEMA GAS CLORO EN POZO 80	196,829	196,829	-	-	-	-
				VIDEO INSPECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ADEME DEL POZO 71	494,650	494,650	-	-	-	-



















#	Descripción del objetivo	Ambito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Recurso propio	Municipal (FAISM-R.33)	FAIS Estatal	PROAGUA	PRODDER*			
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	CATASTRO AGUA Y DRENAJE	ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ZONAS QUE CONFORMAN EL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	63,674,174	63,674,174	-	-	-	-			
				DIAGNÓSTICO Y VIDEO INSPECCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAPAMI	3,376,079	3,376,079	-	-	-				
				SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 30 (BER-ETAPA EL COBANO) DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.	17,184,429	10,310,558	-	-	6,873,872				
		RURAL	DRENAJE	AGUA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS	498,652	249,327	-	-	-	-	249,325	
					CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL CARRIZALITO	496,561	248,281	-	-	-	-	-	248,280
					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES NUEVA ITALIA, FRACCION EL GUAYABO Y LOS CISNEROS	1,996,965	-	998,483	998,483	-	-	-	-
					CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO.	2,393,155	-	2,393,155	-	-	-	-	-
					LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CUCHICUATO	2,899,012	2,899,012	-	-	-	-	-	-
					REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JUAREZ (HERMANO MATEO).	2,798,874	-	2,798,874	-	-	-	-	-
					REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA.	1,684,608	-	1,684,608	-	-	-	-	-
					VIDEO INSPECCION Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD VENADO DE SAN LORENZO	199,998	199,998	-	-	-	-	-	-
					AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE BERNALES (ETAPA TRES DE TRES)	3,963,885	-	1,981,942	1,981,942	-	-	-	-
					AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD TOMELOPITOS	1,980,041	1,980,041	-	-	-	-	-	-
					AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	1,597,811	-	1,597,811	-	-	-	-	-
					AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, GUADALUPE VICTORIA E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CUCHICUATO.	2,249,311	-	2,249,311	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL, LA LOMITA, DEL CANAL, ANTONIO GARCÍA, AV. DEL TRABAJO Y PRIV. SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE MARQUEZ	4,050,933	-	4,050,933	-	-	-	-	-					
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 30 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ.	781,656	-	781,656	-	-	-	-	-					

#	Descripción del objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Recurso propio	Municipal (FAISM-R.33)	FAIS Estatal	PROAGUA	PRODDER*
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	RURAL	SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BAÑOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE VENADO DE YOSTIRO Y TINAJA DE BERNALES	300,000	300,000	-	-	-	-
Total Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente					192,694,959	192,694,959	42,965,319	216,25,331	2,848,264	14,489,263
3	Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento	CABECERA MUNICIPAL	EFICIENCIA	SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (1ER ETAPA) SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA EN CD INDUSTRIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2022	997,475	997,475	-	-	-	-
Total Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento					26,273,862	26,273,862	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN PEDRO 2DA ETAPA DE INDEPENDENCIA A IRAPUATO					1492,292	746,147	-	-	-	746,145
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LAS HERAS (1RA ETAPA)					971,315	971,315	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PURÍSIMA DEL JARDÍN					3,432,972	3,432,972	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BLVD SOLIDARIDAD					2,997,298	2,997,298	-	-	-	-
OBRAS DE SEGURIDAD E HIGIENE					3,168,924	3,168,924	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 2A. SECCIÓN.					4,060,626	4,060,626	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA DESALOJO DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS PALMAS.					5,926,355	5,926,355	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL CÁRCAMO 37 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CD. INDUSTRIAL					3,868,232	3,868,232	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL CÁRCAMO 38 Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL					2,174,491	2,174,491	-	-	-	-
REPARACIÓN DE COLAPSO PLUVIALES 2022 ZONA NORTE					1,999,476	1,999,476	-	-	-	-
REPARACIÓN DE COLAPSO PLUVIALES 2022 ZONA SUR					1,999,906	1,999,906	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA AZTECA					2,225,600	2,225,600	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA LAS HERAS 3RA SECCIÓN					1,974,913	1,974,913	-	-	-	-

#	Descripción del objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Recurso propio	Municipal (FAISM-R.33)	FAIS Estatal	PROAGUA	PRODDER*
4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	CABECERA MUNICIPAL	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA NUEVA FE 2000	3,791,191	3,791,191	-	-	-	-
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAS ALAMEDAS	3,960,445	1,980,223	-	-	-	1,980,222
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LUIS H. DUCOING Y PRIVADA RUIZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANITA	1,799,307	-	1,799,307	-	-	-
				REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS 2022	2,862,746	2,862,746	-	-	-	-
Total Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio				48,686,089	44,160,414	1,799,307	-	-	2,726,367	
5	Aprovechar las aguas residuales para su reúso con la perspectiva de una economía circular	CABECERA MUNICIPAL	SANEAMIENTO	BARDA PERIMETRAL PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO	998,113	998,113	-	-	-	-
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y PUERTA EN PTAR SAN ROQUE	209,967	209,967	-	-	-	-
				CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ALOJAMIENTO DE MEDIDOR DE FLUJO Y ADECUACIÓN EN CANAL PARA PUNTO DE MUESTREO	199,808	199,808	-	-	-	-
				INSTALACIÓN ELÉCTRICA LABORATORIO PARA PLANTA SALIDA A PUEBLO NUEVO SEGUNDA ETAPA	699,807	699,807	-	-	-	-
Total Aprovechar las aguas residuales para su reúso con la perspectiva de una economía circular				2,107,695	183,308,553	44,764,627	21,625,331	2,848,264	17,215,630	
Total General				269,762,405	183,308,553	44,764,627	21,625,331	2,848,264	17,215,630	

*El importe final de recurso PRODDER 2022, será definitivo una vez que se cuente con la aprobación de CONAGUA respecto de la propuesta revisada.

ANEXO C

ACCIONES DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
La Calera	01/10/2022	Desazolve	Se limpiaron 3 pozos de visita de la calle Felipe Ángeles.
San Vicente	01/10/2022	Desazolve	Se desazolvó la calle Benito Juárez de la escuela primaria a la boca de tormenta desazolvando 500 metros de línea general y 5 pozos de visita.
Arandas	03/10/2022	Revisión de drenaje a solicitud de oficio	Se revisó la línea principal observando que los pozos de visita tenían nivel bajo por lo que solo se sugirió la limpieza de las bocas de tormenta las cuales presentan azolve.
	03/10/2022	Revisión de terreno para construcción de cárcamo o de bombeo	Se revisó el terreno para la posible construcción de cárcamo o de bombeo llegando a la conclusión que el terreno no es apto por los niveles, además de la lejanía del retorno de aguas negras.
	07/10/2022	Capacitación del uso de gas cloro	Se capacitó al comité del agua de la comunidad Arandas sobre el uso de gas cloro, pero se les recomendó el seleccionar a una persona para darle una capacitación más completa.
El Carrizalito	25/10/2022	Revisión de predios para la construcción del cárcamo	No factible los terrenos propuestos.
	03/10/2022	Socialización de tema de agua potable	Se visitó la comunidad de Carrizalito para revisar el tema de agua potable para las calles Álvaro Obregón, Los Jiménez, Las Arenas y Martín Moreno. Se acordó que de estar de acuerdo las calles recibirán el material (tubos) para poder realizar las conexiones de agua potable para dichas calles hay proyecto, se levantó minuta/mano de obra a cargo de ellos.
La Garrida	03/10/2022	Instalación y capacitación del clorador en el pozo de la comunidad La Garrida	Se instaló el clorador en la comunidad La Garrida y se dio una capacitación del uso del mismo al comité de agua de la localidad.

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
El Carmen	04/10/2022	Reunión con la comunidad del Carmen para tema de conexión de agua potable para abastecer a la comunidad de El Carmen 2	Se llevó a cabo reunión con la delegación y comité de agua potable de la comunidad El Carmen para resolver el tema de la conexión de agua potable para abastecer a la comunidad El Carmen 2, la comunidad El Carmen no aceptó la conexión.
Ex Hacienda de Márquez	06/10/2022	Revisión de drenaje sanitario	Se acudió a la comunidad para la revisión del drenaje sanitario y poder orientar al comité en el desazolve del mismo.
	08/10/2022	Desazolve	Se limpiaron 150 m ² más. De línea general 5 pozos de visita.
Comedero Grande	07/10/2022	Instalación y capacitación de clorador en la comunidad Comedero Grande	Se instaló el clorador en la comunidad Comedero Grande y se capacitó al comité para su uso y mantenimiento.
	08/10/2022	Desazolve	Se limpiaron 220 m ² de línea general y 4 pozos de visita y en calle José L. Portillo se limpió un pozo de visita y 50 m ² de línea general.
Purísima del Progreso	24/10/2022	Visita a instalación de tubería para drenaje de la calle Molinero	Se visitó a la comunidad junto con personal de operación para la supervisión de la instalación de tubería de drenaje sanitario en la calle Molineros.
	10/10/2022	Solicitud de pipa de agua	Se proporcionó información a los habitantes respecto de servicios y costo de pipa de agua.
Carrizal el Grande	12/10/2022	Solicitud de pipa de agua	Se proporcionó el apoyo con dos pipas de agua, una en la primaria y la segunda en la secundaria de la localidad.
	10/10/2022	Solicitud de pipa de agua	Se proporcionó información a los habitantes respecto de servicios y costo de pipa de agua.
El Romeral	10/10/2022	Visita a la comunidad para revisar alcances de obra	Se realizó recorrido en las calles en las que se realizará la ampliación del drenaje para las obras 2022.
San Cristóbal	11/10/2022	Solicitud de pipa de agua	Servicio de segunda pipa de agua a primaria.
San Javier	10/10/2022	Reporte drenaje tapado	Se revisó línea con varillero, se solucionó el problema en las líneas de drenaje.
San Nicolás Temascalatio	10/10/2022	Solicitud de pipa de agua	Se proporcionó información a los habitantes respecto de servicios y costo de pipa de agua.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
Valencianita	10/10/2022	Visita a la com unidad para revisar alcances de obra	Se realizó una visita a las calles en las que se realizará la ampliación del drenaje para las obras 2022, para corroborar información de las mismas.
Guadalupe Paso Blanco	11/10/2022	Socializar condiciones de tanque	La acción perm anecerá en espera.
	13/10/2022	Revisión de conexiones	Por acuerdo se dejaron instaladas cajas de válvulas.
	18/10/2022	Gira con Presidenta Municipal	Se realizó la gira Alcaldesa, para apoyar con las peticiones o dar seguimiento de alguna petición que este en proceso.
Loma de Juarez (Herm ano Mateo)	24/10/2022	Revisión de drenaje y agua potable	Se realizó un recorrido por las calles de Guadalupe de Rivera para atender la solicitud de algunos pobladores, ya que la tubería pasa por debajo de las casas y es necesario rediseñar el abastecimiento.
	11/10/2022	Visita a la com unidad para revisar alcances de obra	Se realizó recorrido en las calles de la com unidad en las que se realizará la ampliación de agua potable.
Cuarta Brigada	12/10/2022	Limpieza del Cárcamo y desazolve de línea general	Se citó a la com unidad para revisar el avance del desazolve del cárcamo, para a su vez realizar por parte de JAPAM, el desazolve de la línea general.
La Candelaria	13/10/2022	se realizó capacitación de cloración en el pozo de la com unidad, al Comité de Agua	Se realizó capacitación al comité del agua potable, para uso y colocación del hipoclorito en el pozo de la com unidad.
San Roque	13/10/2022	Revisión y desazolve de boca de tormenta tapada afuera de la escuela	Se revisó y se metieron varillas en la boca de tormenta para quitar tapón y el drenaje fluyera, se dejó funcionando.
Aldama	17/10/2022	Gira con Presidenta Municipal	Se realizó la gira Alcaldesa, para apoyar con las peticiones o dar seguimiento de alguna petición que este en proceso.
Cerrito de las Huertas	17/10/2022	Caracterización de infraestructura	Se visitó la com unidad para realizar una caracterización de la infraestructura.
El Guayabo	17/10/2022	Caracterización de infraestructura	Se visitó la com unidad para realizar una caracterización de la infraestructura y se detectó que el clorado no está en funcionamiento por lo que se agendo una revisión.
Malvas	17/10/2022	Gira con Presidenta Municipal	Se realizó la gira Alcaldesa, para apoyar con las peticiones o dar seguimiento de alguna petición que este en proceso.

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
Purísima de las Flores	17/10/2022	Caracterización de infraestructura	Se visitó la com unidad para realizar una caracterización de la infraestructura.
Rancho Nuevo de Dolores	17/10/2022	Caracterización de infraestructura	Se visitó la com unidad para realizar una caracterización de la infraestructura.
La Soledad	20/10/2022	Socialización tema agua potable	Solicitan apoyo con tubería agua potable.
Rivera de Guadalupe	18/10/2022	Socialización de las calles sin drenaje en la com unidad	Se realizó una reunión con habitantes de las calles sin drenaje, se les proporcionó una explicación técnica.
Tejamani	18/10/2022	Socialización JAPAMI RURAL	Se llevo a cabo una reunión con la delegada de la Comunidad, para socializar el tema de agua.
Tomelopitos	26/10/2022	Revisión de drenaje	Se visitó a la com unidad y se apoyará con la donación de 15 tubos.
La Soledad	04/11/2022	Desazolve	Se sondeó línea general y se lim piaron pozos de vista de la calle Allende.
San José De Jorge López	09/11/2022	Desazolve	Se sondeó línea general y se lim piaron pozos de vista de la calle Misericordia.
La Caja	05/11/2022	Desazolve	Desazolve de las calles flores Magón y Pinos.
Tinaja de Bernaldes	06/11/2022	Desazolve	Desazolve de la calle Deportiva.
Peñuelas	07/11/2022	Desazolve	Se succionaron fosas sépticas, se dejaron lim pias.
Tomelopez	16/11/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad, obteniendo datos de abastecimiento de agua y de drenaje.
Cuchicuato	08/11/2022	Supervisión de obra	Localización de tramos de la obra de drenaje sanitaria.
San Javier	09/11/2022	Lim pieza de fosas	Se realizó la lim pieza de 10 fosas sépticas.
San Agustín de Los Tordos	10/11/2022	Lim pieza de fosas	Se realizó la lim pieza de 8 fosas sépticas.
	15/11/2022	Desazolve	Se sondeó línea general y se lim piaron pozos de vista de la calle Guanajuato.
	16/11/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad, obteniendo datos de abastecimiento de agua y de drenaje.
	16/11/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad, obteniendo datos de abastecimiento de agua y de drenaje.
	17/11/2022	Tema de drenaje	Revisión de drenaje en las calles con problemática.

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
Munguía	18/11/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad, obteniendo datos de abastecimiento de agua y de drenaje.
Rancho Nuevo de Yósti	18/11/2022	Visita de campo/proyecto	Revisión de terreno para donación de terreno y generación de proyecto ejecutivo de drenaje, con la delegación de la com unidad.
	25/11/2022	Visita de campo/proyecto	Revisión de documentos con el dueño de terreno posible donante.
Refugio De Munguía	18/11/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad, obteniendo datos de abastecimiento de agua y de drenaje.
San José De La Laguna	18/11/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad, obteniendo datos de abastecimiento de agua y de drenaje.
	22/11/2022	Tem a de clorador	Se apoyó con la revisión de clorador y asesoramiento en el manejo y uso de bomba clorador.
Carrizal Grande	19/11/2022	Desazolve	Se realizó el desazolve de calle el Durazno, se dejó funcionando.
Pedro Arteaga	25/11/2022	Reunión para acuerdos	Se levantó el censo de usuarios de agua potable y drenaje sanitario.
	29/11/2022	Visita para acuerdos	Se acordó que JAPAMI proporcionara la tubería y un mes de retroexcavadora.
El Coecillo	26/11/2022	Desazolve	Se realizó el desazolve de calle el Francisco Javier Mina, se dejó funcionando.
Cuarta Brigada	28/11/2022	Abastecimiento de agua	Se llevó a cabo una reunión para revisar el abastecimiento de agua, acordándose en una nueva reunión con el dueño del pozo.
El Progreso	28/11/2022	Drenaje pluvial	Revisión de tema de drenaje pluvial con delegación, com ité de agua y con Desarrollo Rural.
La Calera	28/11/2022	Drenaje pluvial	Revisión de tema de drenaje pluvial con delegación, com ité de agua y con Desarrollo Rural.
Valenciana de Yósti	28/11/2022	Revisión de terreno	Revisión de terreno para donación de terreno y generación de proyecto ejecutivo y de drenaje, con la delegación de la com unidad.
Visita Hermosa III	28/11/2022	Visita para inicio de obra	Visita a obra de agua potable en las calles con el contratista de JAPAMI.
Camino a la Sonaja	29/11/2022	Reunión con habitantes, solicitan abastecimiento de agua	Para abastecimiento de agua se les apoyará con maquinaria y material de construcción, los habitantes de la com unidad pondrán la mano de obra.

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
Santa Bárbara	29/11/2022	Visita para inicio de obra	Visita a obra con el contratista de JAPAMI.
Ex-Hacienda de Buena Vista	30/11/2022	Reunión con Delegación de la Com unidad	Se levantara un censo de los usuarios beneficiados con el drenaje sanitario.
El Coecillo	01/12/2022	Desazolve	Se desazolvó la línea principal y se les recomendó que tuvieran siempre pre la descarga final limpia, ya que hay mucha hierba y esto impide la salida de los lodos del drenaje.
Pedro Arteaga	01/12/2022	Reunión para obra por Cooperación	Se llevó a cabo una reunión con los de la Organización Antorcha Cam pesina para ver la obra por cooperación de drenaje.
Nueva Colonia Copalillo	02/12/2022	Revisión de las calles para proyecto de agua potable y drenaje sanitario	Visita en calles Grillito Cantor, Vicente Suarez, Agustín Melgar, Juan Escutia y Juan de la Barrera.
Tom elopitos	05/12/2022	Revisión de las calles con problemas de azolve	Se revisaron las calles: Morelos, Guanajuato e Independencia las cuales presentan pozos de visita con niveles altos y requieren de desazolve con el camión hidroneumático.
	15/12/2022	Desazolve	Se desazolvó la calle Morelos y la calle Guanajuato.
Munguía	30/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad de Tomelopitos.
	05/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad Refugio de Munguía.
La Calera	06/12/2022	Revisión de las calles para proyectos 2023	Se localizaron y visitaron las calles: Ignacio Ramírez y Privada Confin.
	28/12/2022	Desazolve	Se sondeó la línea drenaje y dos pozos de visita, en la calle Priv. Salam anca.
Carrizal Grande	07/12/2022	Revisión de calles para proyectos 2023	Se localizaron y visitaron las calles: Toronja, Naranjo, Ladera y Primavera, para la ampliación de la red de agua potable.
	09/12/2022	Revisión de calles para proyectos 2023	Se localizaron y visitaron las calles: Benemérito y Bicentenario para el proyecto de ampliación de drenaje sanitario.
Ejido Malvas	29/12/2022	Red de drenaje	Visita de calles para posible proyecto ejecutivo para red de drenaje.
	14/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad La Caja.
San Jose de Bernalejo	15/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la com unidad San José de Bernalejo.

JCO

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
Purísima del Jardín	19/12/2022	Entrega de obra	Se llevó a cabo la entrega de la Obra "Construcción de Drenaje Pluvial en la Purísima del Jardín" a Delegación y Comité de agua, acompañado de personal de operación, supervisión del Organismo Operador, así como de Municipio.
Cuarta Brigada	19/12/2022	Pozo	Reunión para revisar el tema de pozo agrícola en desuso para posible cambio a consumo humano y dar agua a la comunidad Cuarta Brigada.
Hermano Mateo	19/12/2022	Comité	En conjunto con la Dirección de Desarrollo Rural se asistió a la conformación del comité pro obra y resolver dudas a la comunidad de la obra red de distribución en la comunidad Loma de Juárez (Hermano Mateo) " <i>Rehabilitación de las líneas de agua potable en la localidad Loma de Juárez Hermano Mateo</i> ".
Refugio de Munguía	19/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la comunidad Refugio de Munguía.
Laguna Larga	20/12/2022	Gira con Presidenta Municipal	Entrega de obra de calle pavimentada.
El Garbanzo	21/12/2022	Gira con Presidenta Municipal	Entrega de bordería.
San Juan Temascalco	21/12/2022	Gira con Presidenta Municipal	Entrega de bordería.
Vista Hermosa III	21/12/2022	Gira con Presidenta Municipal	Entrega de bordería.
San Javier	21/12/2022	Desazolve	Se sondeó línea general y se limpiaron pozos de visita, se descubrió un pozo de visita, en la calle Priv. Del Bosque.
Peñuelas	21/12/2022	Actividad con camión hidroneumático	Se limpiaron las 5 fosas restantes.
Rancho Nuevo del Lilanito	22/12/2022	Desazolve	Se desazolvieron las calles: Allende, Santos Degollado y Matamoros.
Malvas el Resbalón	27/12/2022	Red de drenaje	Atención de folios de alcaldesa para proyecto ejecutivo de calles sin servicio de drenaje.
	29/12/2022	Red de drenaje	Visita de calles para posible proyecto ejecutivo para red de drenaje.

COMUNIDAD	FECHA ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
Ejido Malvas la Argolla	29/12/2022	Red de drenaje	Visita de calles para posible proyecto ejecutivo para red de drenaje.
Tomelópez	30/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la comunidad Tomelópez
Guadalupe Paso Blanco	30/12/2022	Caracterización de infraestructura	Se realizó la caracterización de la comunidad Guadalupe Paso Blanco

