

## TARJETA INFORMATIVA

07 de agosto de 2020

OBRA	<b>CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS ARCOS, DEL MPIO. DE IRAPUATO, GTO. (2DA ETAPA)</b>
NUMERO CONTRATO	JAPAMI/LS/2020-02
CONTRATISTA	RDI URBANIZADORA S.A. DE C.V.

### ANTECEDENTES:

SE HACE MENCIÓN QUE LA PRESENTE 2DA ETAPA, AL IGUAL QUE DESDE LA PRIMERA ETAPA, SE INCLUYE UN RELLENO FLUIDO FC 40 KG/CM2 EN LA MITAD DE LA PARTE INFERIOR DE LA TUBERIA DE 60", ESTO DETERMINADO YA QUE EL ANCHO DE CALLE HA LIMITADO EL TALUD DE LA ZANJA ASI COMO LA POSTERIA CFE, TELMEX EXISTENTES.

REFERENTE AL CONCRETO FC 250KG/CM2 SE ESTA COLOCANCO EN LAS POZO TIPO CAJA QUE ABRAZAN DICHA TUBERIA DE 60" QUE INCLUYE LOSA INFERIOR, MUROS, Y LOSA SUPERIOR POR LAS LONGITUDES Y LAS DIFICULTADES DE DIMENSIONES EN EL TERRENO ES NECESARIO SUMINISTRAR CON BOMBA AMBOS CONCRETOS.

SE ANEXA CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO.



Alejandro Zúñiga Ramos  
Supervisor de Obra





**IRAPUATO**  
¡mejor ciudad!



**gto**  
Orgullo y compromiso de todos

## TARJETA INFORMATIVA

TERMINO 1RA ETAPA E INICIO DE LA 2DA ETAPA




2DA ETAPA YA SE ENCUENTRA CON CONCRETO

LINEA ROJA POR SUMINISTRAR CONCRETO CORRESPONDIENTE A LA 2DA ETAPA

Alejandro Zúñiga Ramos  
Supervisor de Obra

## TARJETA INFORMATIVA

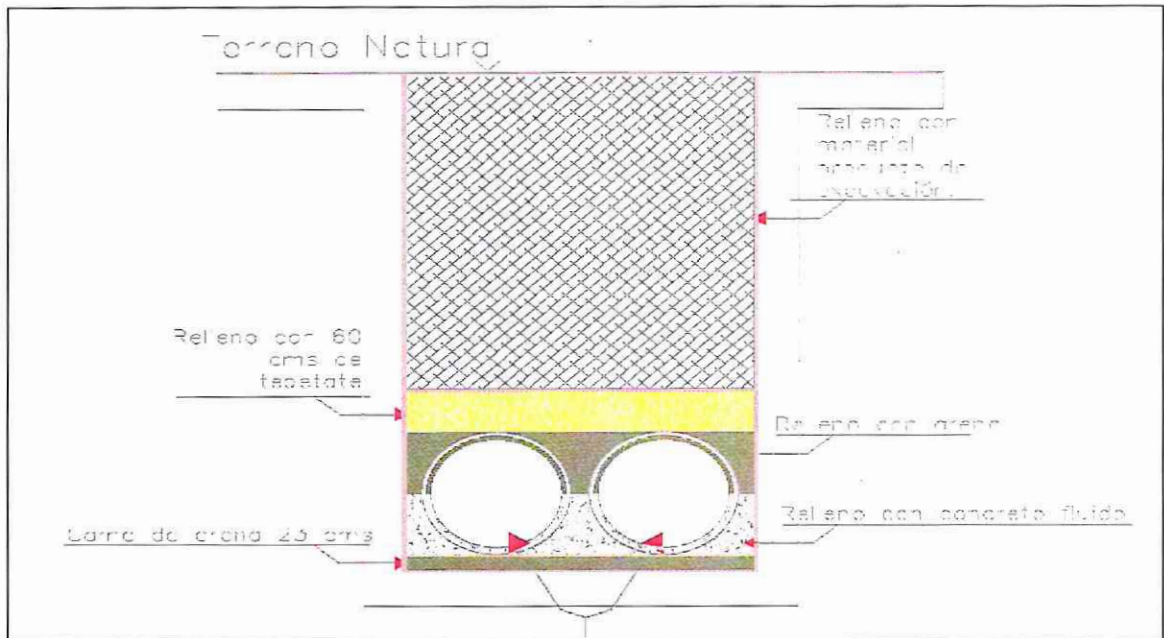

TUBERIA 60" PEAD



9




**IRAPUATO**  
¡mejor ciudad!



**gto**  
Guanajuato  
El estado que  
comprende  
de todos

## TARJETA INFORMATIVA

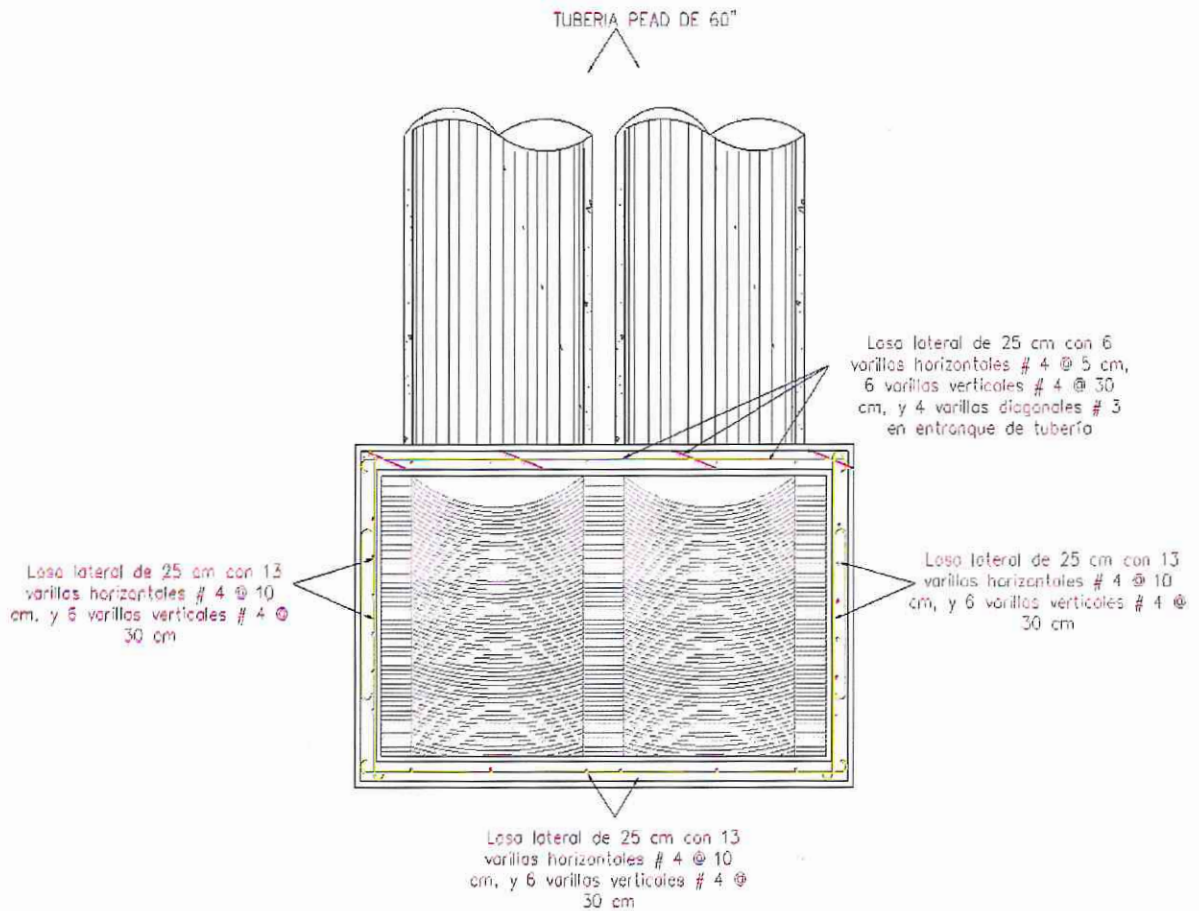

Alejandro Zúñiga Ramos  
Supervisor de Obra
