



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
471		
08	02	2021

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: SERVICIOS GENERALES JAPAMI / ING. ROBERTO RIVERA

DOMICILIO:

CIUDAD: IRAPUATO, GTO.

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 8" CON 28 1/2 TRAMOS DE COLUMNA DE 8"

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	
1	LOTE	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO , POZO No. 57, COLONIA, ERNESTO CHE GUEVARA, 28 TRAMOS Y 1/2 DE TUBERIA DE COLUMNA DE 8" . 08/02/2021	5,000.00	5,000.00
1	LOTE	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO , POZO No. 57, COLONIA, ERNESTO CHE GUEVARA, 28 TRAMOS Y 1/2 DE TUBERIA DE COLUMNA DE 8". 09/02/2021	5,000.00	5,000.00
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		10,000.00
		I.V.A.		1,600.00
		TOTAL	\$	11,600.00

- * CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
- * TIEMPO DE ENTREGA : 1 DÍA

ATENTAMENTE



ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 62 7 52 88 ID 92*856756*1

behisa1000@hotmail.com

08/02/2021 DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 57, COL. CHE GUEVARA

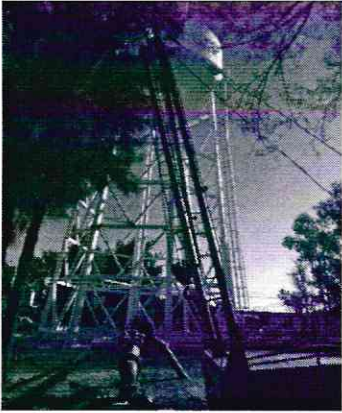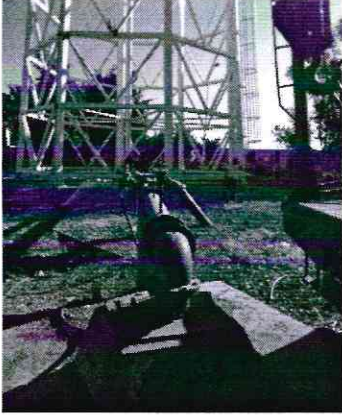

09/02/2021 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 57, COL. CHE GUEVARA



[Handwritten signature]



TARJETA INFORMATIVA

08 de febrero del 2021

TI-OMP-32

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra DESINSTALACION e INSTALACION equipo de bombeo.


Por este medio se informa que el 08 de febrero del presente se realiza maniobra en el pozo 57 ubicado en la col. Che Guevara atendiendo el folio 0002758020 Equipo de bombeo sumergible dañado

Desinstalación Inicio 14:00hrs y termino 22:00 hrs

El 08 de febrero del presente se empieza la desinstalación con el proveedor BHISA

Se desinstala equipo de bombeo siendo lo siguiente:

- 1 Bomba sumergible MARCA "AS PUMPS" modelo 9as1l -3 no. bosucel-1
- 1 Motor sumergible marca AS MOTORS de 125 hp no. serie 921780744
- 175 metros de columna de 8" con 2 coples de cuerdas mixtas
- 175 mts de cable sumergible cal. 3 x 3/0 awg
- 175 mts de poliducto para sondeo de 1"

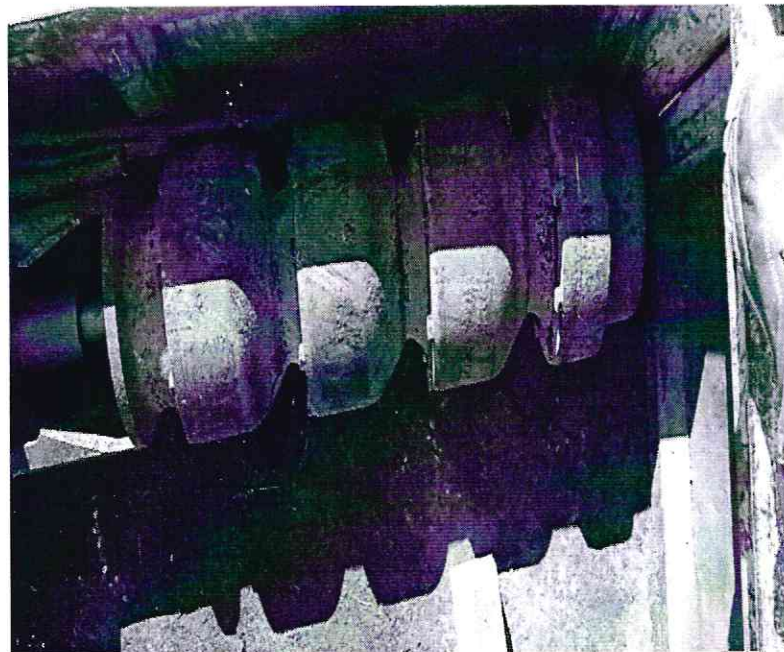

08/02/2021



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021


08 de febrero de 2021

TI-OMP-32

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra DESINSTALACION e INSTALACION equipo de bombeo

Al momento de realizar la prueba eléctrica del cable sumergible instalado 3 x 3/0 AWG se encuentra el cable húmedo y dando valor bajo por lo que se procede a realizar cambio de cable sumergible.

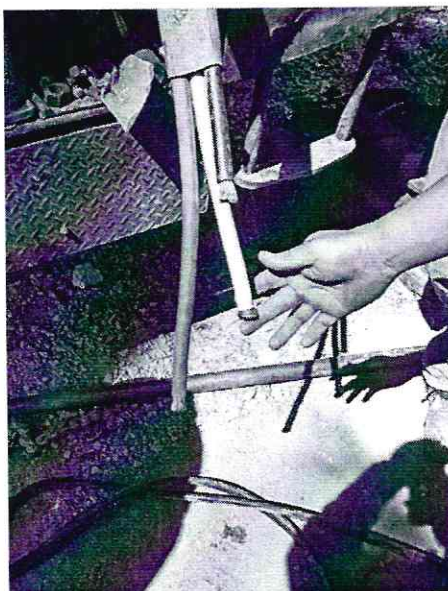

Instalación Inicio 10:00 AM y termino 22 hrs


El 9 de Febrero del presente se empieza la instalación con el proveedor BHISA. Con equipo de bombeo **NUEVO**


Equipo de bombeo siendo lo siguiente:

- Motor sumergible Marca KSB S°K190020-06 Modelo UMA 200D 75/21
- Bomba sumergible Marca KSB S°KSB2008570101 Modelo UPA200B80/6
- 175 metros de columna de 8" con 2 coples de cuerdas mixtas
- 175 mts de cable sumergible cal. 3 x 2/0 AWG (USADO BUENO)
- 175 mts de poliducto para sondeo de 1



Sin más por el momento cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes


OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTO DE POZOS


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
475		
14	02	2021

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: SERVICIOS GENERALES JAPAMI / ING. ROBERTO RIVERA

DOMICILIO:


CIUDAD: IRAPUATO, GTO.

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 8" CON 19 1/2 TRAMOS DE COLUMNA DE 8". POZO No. 58 ZOOLOGICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	LOTE	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO , POZO No. 58, ZOOLOGICO, 19 TRAMOS Y 1/2 DE TUBERIA DE COLUMNA DE 8". 14/02/2021	
			7,500.00 7,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	7,500.00
		I.V.A.	1,200.00
		TOTAL	\$ 8,700.00

- * CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
- * TIEMPO DE ENTREGA : 1 DÍA

ATENTAMENTE




 ING. DIONICIO FUENTES CISNEROS
 GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 62 7 52 88 ID 92*856756*1

behisa1000@hotmail.com

14/02/2021 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 58, ZOOLOGICO, 19 1/2 TRAMOS DE 8", CON VALVULA CHECK DE 8"

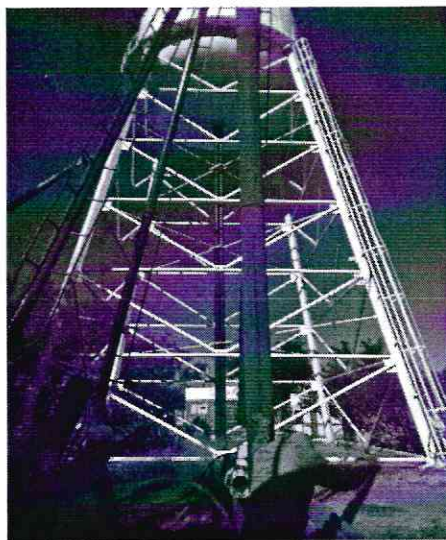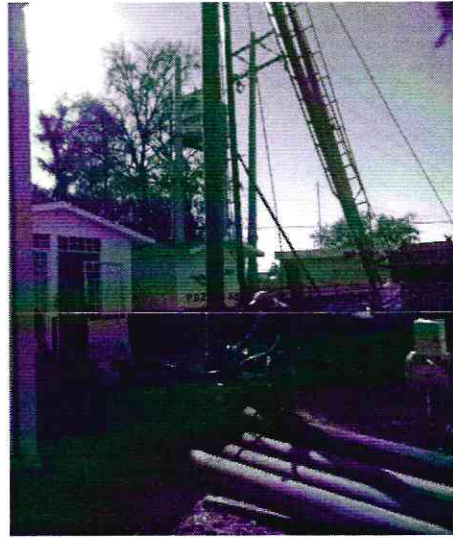

[Handwritten signature]



Handwritten signature and a large blue scribble.



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

14 de febrero de 2021

TI-OMP-67

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra DESINSTALACION e INSTALACION equipo de bombeo


Por este medio se informa que el 14 de febrero del presente se realiza maniobra en el pozo 58 ubicado en parque hidalgo atendiendo el folio 0002758020.

Instalación Inicio 09:00 AM y termino 16 hrs

El 14 de Febrero del presente se empieza la instalación con el proveedor BHISA. Con equipo de bombeo **NUEVO**

Equipo de bombeo siendo lo siguiente:

- Motor sumergible Marca TX PUMPS N° 92202421862 125 HP N°SIAC 6941
- Bomba sumergible Marca GOULDS MOD:9RCLC/4 ,55LPS CONTRA 140 MTS

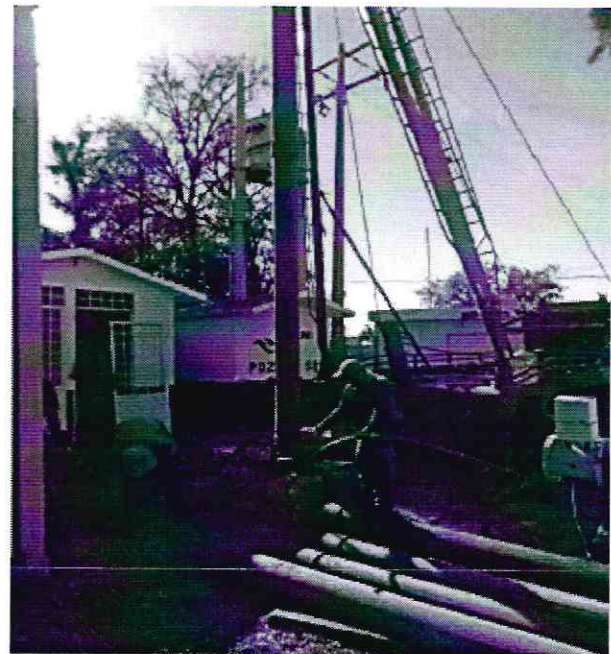

Sin más por el momento cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes


OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx

Página 2 de 2

