



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 23 DE MARZO 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 96

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: RINCONADA DE LOS FRESNOS

SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		X
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 96 "RINCONADA DE LOS FRESNOS"

EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO YA QUE SUFRIO SOBRECARGAR.

DESINSTALACION

- BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULDS MODELO 9RCLC-3 SERIE I457
- MOTOR SUMERGIBLE MARCA GABRIEL CAPACIDAD 100 HP SERIE 751480266
- 20 TRAMOS DE TUBO 8" X 6.10 MTS.
- 125 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 2/0.
- 122 MTS DE POLIDUCTO DE 1".

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
 JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landis no. 1720, Col. Independencia
 C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
 www.japami.gob.mx




Pozo 96 "RINCONADA DE LOS FRESNOS"

EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 DESPUES DE LAS 12:00 PM EN FIN DE SEMANA

INSTALACIÓN

- BOMBA SUMERGIBLE MARCA INDAR MODELO UGP-0810 SERIE 102115 (EQUIPO REPRARADO)
- MOTOR SUMERGIBLE MARCA INDAR MODELO ML-18-3/100 DE 133HP SERIE IA 102116 (EQUIPO REPARADO)
- 20 TRAMOS DE TUBO 8" X 6.10 MTS.
- 125 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 2/0.
- 122 MTS DE POLIDUCTO DE 1".

MANIOBRA

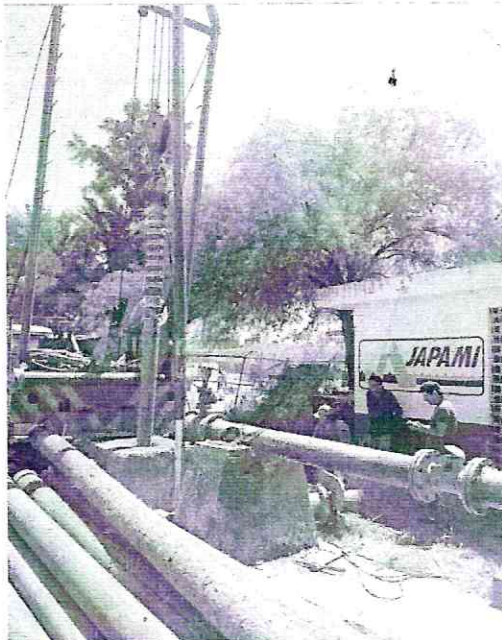

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO: JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: viernes, 22 de marzo de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 50

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: "FRACC.VILLAS DE IRAPUATO"

SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 50 "FRACC. VILLAS DE IRAPUATO"

EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALAR MOTOR QUE SE HABIA MANDADO REPARAR.

DESINSTALACION

- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA LUBI MOD W160/6
- 1 MOTOR SUMERGIBLE Marca LUBI modelo L86150-H S°21709300
- 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6,10 M.
- 7 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6,10
- 152 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 3/0 AWG,
- 149 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: domingo, 24 de marzo de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 50

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: "FRACC.VILLAS DE IRAPUATO"

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		X
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

TARJETA INFORMATIVA



Pozo 50 "FRACC. VILLAS DE IRAPUATO"

EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2019 (DIA DOMINGO) SE REALIZÓ LA MANIOBRA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO

INSTALACIÓN

- MOTOR MARCA INDAR MODELO ML-25-3/070 (EQUIPO NUEVO)
- BOMBA MARCA INDAR MODELO UGP-1020-05 (EQUIPO NUEVO)
- 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6,10 M.
- 7 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6,10
- 152 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 3/0 AWG,
- 149 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA

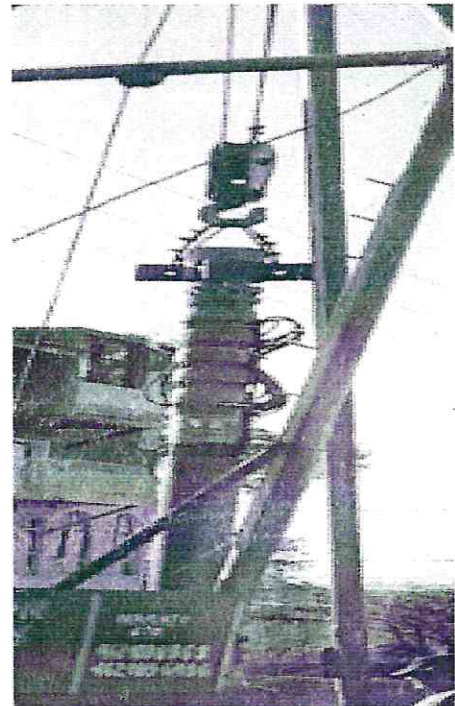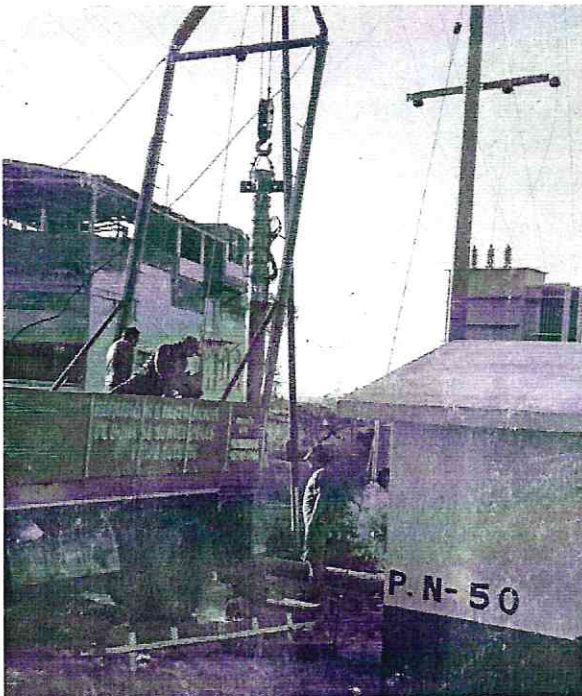


RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

viernes, 12 de abril de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 72

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: CD. INDUSTRIAL

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


POZO 72 "CD. INDUSTRIAL"

EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EL EQUIPO INSTALADO ES REPARADO POR EL PROVEEDOR INDAR MÉXICO S.A DE C.V

INSTALACIÓN

- 18 Tramos de Tubo de 8" x 6.10 MTS
- 7 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC PARA DESARENADOR
- 130 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 2/0 AWG,
- 130 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1".
- BOMBA SUMERGIBLE MARCA INDAR MODELO UGP-0840-4 SERIE A105916
- MOTOR SUMERGIBLE MARCA INDAR CAPACIDAD 111 HP SERIE A105916

MANIOBRA

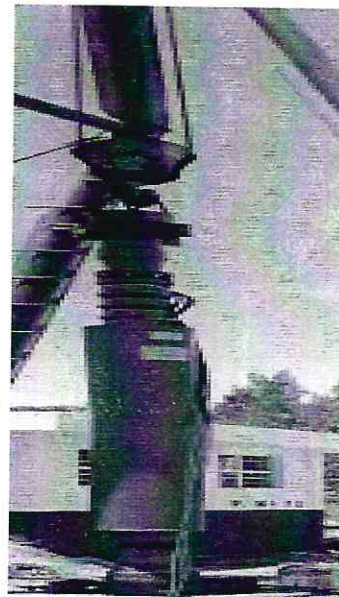

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Tarjeta Informativa.

Irapuato, Gto. 15 de abril del 2019

Por medio del presente para informarle, que el día 11 de abril del presente año la U-503 (HIAB) recibió un equipo de bombeo por parte del proveedor externo INDAR MEXICO S.A. el cual había sido reparado y como la entrega se realizó después del horario de trabajo no estuvo personal de control patrimonial para recibirlo, es por ello que el equipo de bombeo se llevó al C-8 para resguardarlo.

Al día siguiente 12 de abril del presente, por cuestiones urgentes se realizó la instalación del equipo de bombeo en el Pozo 72 ubicado en Cd. Industrial ya que esta zona solo cuenta con un equipo de bombeo extra para abastecer dicha zona.

El equipo de bombeo recibido e instalado es:

- 1 Motor sumergible marca INDAR Modelo UGP-0840-4 serie No. A105916
- 1 Bomba sumergible marca INDAR de 111 HP con serie No. A105916

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración agradeciendo su atención prestada.

#6811
ATENTAMENTE

MIGUEL A. FLORES SANTOYO
DEP. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx

Japami
JAPAMI
Juntos con agua
ciudad del futuro



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Vale de Entrada de Reparación
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 11/04/19
Hora: 05:00 PM

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	status	Procedencia	Destino
1	BOMBA	EQUIPO	INDAR	UGP-0840-4	SUMERGIBLE	N/A	A105916	N/A	REPARADO	INDAR MEXICO S.A DE C.V	POZO-72
1	MOTOR	EQUIPO	INDAR	S/D	SUMERGIBLE	111 HP	A105916	N/A	REPARADO	INDAR MEXICO S.A DE C.V	POZO-72

Justificación

ESTE EQUIPO SE REPARÓ POR EL PROVEEDOR INDAR MEXICO S.A DE C.V SE RECIBE POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DEL POZO PARA SU INSTALACIÓN EN EL POZO 72 UBICADO EN CD. INDUSTRIAL.
ATENDIENDO EL FOLIO SIAC 0002344680

NOTA : SE ANEXA ACTA DE ENTREGA

SOLICITA
JOSE MANUEL FARRAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA
GREGA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
JOSE MANUEL FARRAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

RECIBE
MIGUEL FLORES SANTOYO

PARA SU CONOCIMIENTO
J. ENCARNACION
ORDAZO GOVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTO

PARA SU CONOCIMIENTO
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Bvld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.jiapami-gob.mx





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

lunes, 15 de abril de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 25

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: COL. PLAN GUANAJUATO

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


Pozo 25 "COL. PLAN GUANAJUATO"

EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR PRESENTAR FALLA MECÁNICA DEJA DE SACAR AGUA SE DESINSTALA MOTOR SUMERGIBLE TRABAJANDO

DESINSTALCION

- 1 Bomba Sumergible Marca LUBI mod.W125-5ª N°21608362 acoplada a un motor sumergible marca LUBI mod.l86100-h de 100hp N°21608362.
- 22.5 Tramos de Tubo de 6" x 6,10 m.
- 140 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 1/0 AWG,
- 139 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

MANIOBRA

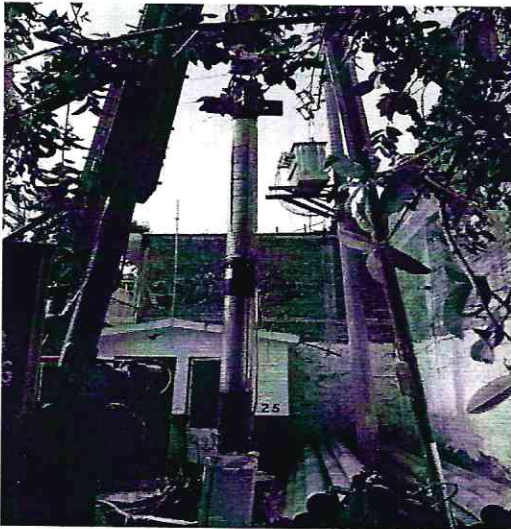

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 08/05/19
 Hora: 10:00 AM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	MOTOR	EQUIPO	LUBI	L86100-h	Sumergible	100 hp	21707748	N/A	Usado	Bueno	POZO-25
1	BOMBA	EQUIPO	LUBI	W125-5a	sumergible	N/A	21707748	N/A	usado	DAÑADO	POZO-25

Justificación

Este Equipo Fue desinstalado del pozo 25 ubicado en la col. Plan Guanajuato el equipo presenta bajo gasto, lo cual se diagnostica que la bomba es la dañada, el motor queda funcional.
 Se entrega a control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico para su resguardo., motor (próxima instalación) bomba (próxima reparación no cuenta con ningunas reparaciones).
 ATENDIENDO EL FOLIO: **0002377056**

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARRAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENAVEN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 Miguel Flores Santiago
 Electromecánico

RECIBE
 JOSE ERNESTO
 ASO. SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
 J. ENCARNA
 OROZCO COVARRUBIAS
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

VALIDA
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAQUER
 CONTROL PATRIMONIAL





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

jueves, 18 de abril de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 73

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: CIUDAD INDUSTRIAL

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		X
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		X
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



Pozo 73 "CIUDAD INDUSTRIAL"

El día 18 de abril del 2019 (día festivo jueves santo) se realizó la maniobra desinstalación de equipo de bombeo por presentar daño mecánico y eléctrico.

DESINSTALACION


- 22 Tramos de tubo de 6" x6.10 mts.
- 140 mts de cable sumg.cal.3 x 2/0.
- 135 mts de poliducto de 1".
- 1 Bomba sumergible Marca GABRIEL Mod.9JMBHC/3 N°G682.
- 1Motor marca GABRIEL de 125 HP N°9212071836.

MANIOBRA

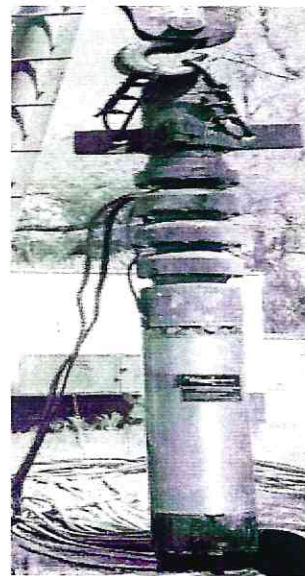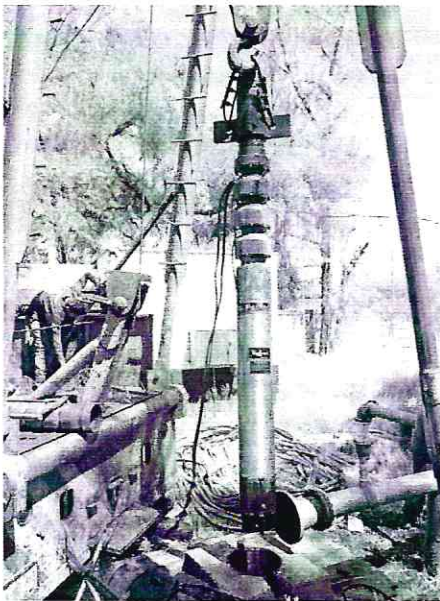



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FAFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2018 - 2021

Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 08/05/19
 Hora: 10:00 AM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	MOTOR	EQUIPO	GABRIEL	N/A	Sumergible	125 HP	9212071836	N/A	USADO	DANADO	POZO-73
1	BOMBA	EQUIPO	GABRIEL	SIN PLACA 3PASOS	sumergible	N/A	SIN DATO	N/A	USADO	DANADO	POZO-73

Justificación

Este equipo fue desinstalado del pozo 73 ubicado en cd. Industrial, el equipo presenta daño mecánico y eléctrico Se entrega a control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico para su resguardo., motor (próxima reparación cuenta con una reparación), bomba (próxima reparación cuenta con una reparación)
 Atendiendo el folio : 0002377904

[Signature]
 SOLICITA
 JOSE MANUEL FARRAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

[Signature]
 AUTORIZA
 GABRIEL MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

[Signature]
 ENTREGA
 Miguel Flores Santoyo
 Electromecánico

[Signature]
 RECIBE
 JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

[Signature]
 PARA SU CONTROL Y MANTENIMIENTO
 L. ENCANON
 OROZCO COLASUBIAS
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

[Signature]
 VALIDA
 MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL




Pozo 73 "CIUDAD INDUSTRIAL"

El día 18 de abril del 2019 (día festivo jueves santo) se realizó la maniobra de instalación equipo de bombeo reparado.

INSTALACION

- 22 Tramos de tubo de 6" x6.10 mts.
- 140 mts de cable sumg.cal.3 x 2/0.
- 135 mts de poliducto de 1".
- 1 Bomba sumergible Marca KSB modelo UPA200B 80/8 n°serieB41034
- 1 Motor sumergible Marca KSB modelo UMA 200 90/21 serie B41034

MANIOBRA

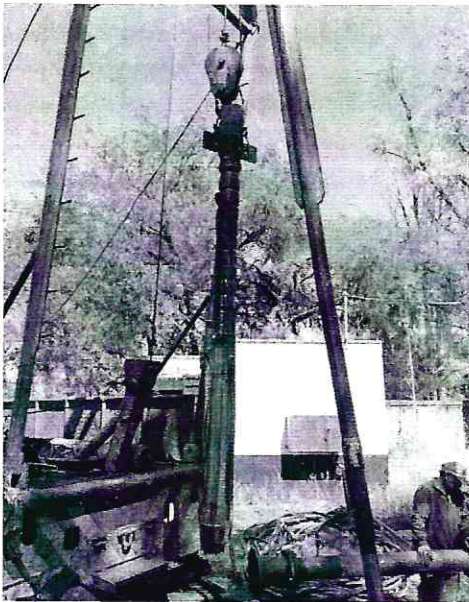

Handwritten signature and initials in blue ink.

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

Handwritten signature in blue ink.
AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2019 - 2021

Vale de Salida de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 17/04/19

Hora: 02:00 PM

Gerencia: Operación y Mantenimiento.

Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	Bomba	Pza	KSB	UPA200B 80/8	sumergible	N/A	B41034	N/A	USADO	REPARADO	POZO 73
1	Motor	Pza	KSB	UMA 200 90/21	sumergible	135 HP	B41034	N/A	USADO	REPARADO	POZO 73

Justificación

Para instalarse en el pozo 73 cd Industrial atendiendo folio siac 2377979

SOLICITA
JOSE MANUEL FARRAN
JEFE DE OPERACION Y MTO DE POZOS

AUTORITA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
OPERADOR DE GRÚA
Isai Castillo E.

PARA SU CONOCIMIENTO
I. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACION Y MANTTO

VÁLIDA
MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.fapami.gob.mx





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

sábado, 20 de abril de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 73

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: CIUDAD INDUSTRIAL

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		X
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA



Pozo 73 "CIUDAD INDUSTRIAL"

El día 19 de abril del 2019, se realizó la maniobra desinstalación de equipo de bombeo reparado. (Este equipo de bombeo fue reparado por el proveedor salvador Valadez vela, el día 25/03/2019, se instaló el día 18/04/2019 se diagnosticó por el personal electromecánico que en su instalación se elevaron las corrientes en las tres líneas., se desinstala equipo para su diagnóstico por garantía)

DESINSTALACIÓN

- 22 Tramos de tubo de 6" x6.10 mts.
- 140 mts de cable sumg.cal.3 x 2/0.
- 135 mts de poliducto de 1".
- 1 Bomba sumergible Marca KSB modelo UPA200B 80/8 n°serieB41034
- 1 Motor sumergible Marca KSB modelo UMA 200 90/21 serie B41034

MANIOBRA

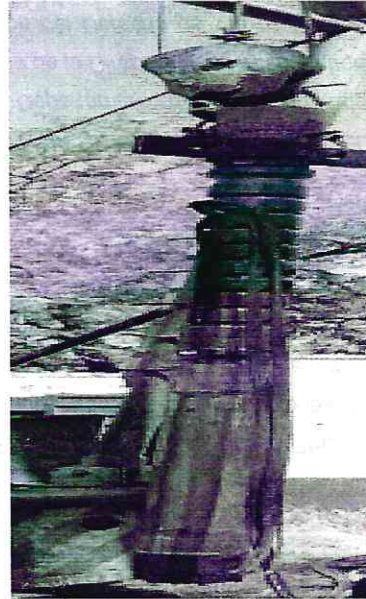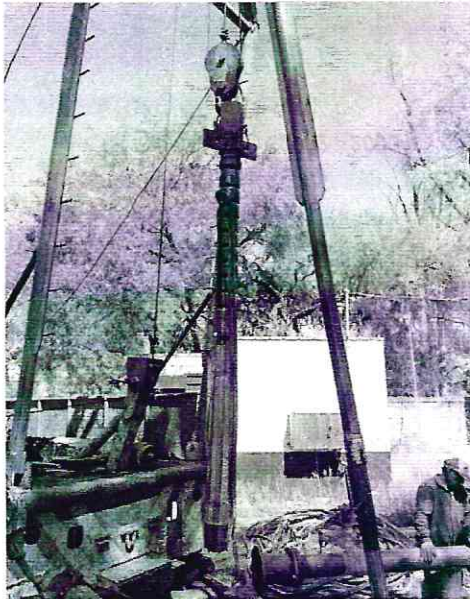

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

[Handwritten signature]

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
 C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
 www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto.

VALE DE SALIDA A REPARACIÓN


Fecha: 23/04/2019	Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Hora: 01:27 pm	Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia	Destino
01	BOBA	PZA	KSB	UPA200B 80/8	SUMERGIBLE	N/A	B41034	N/A	USADO	REPARADO	POZO -73	Salvador Valadez vela
01	MOTOR	PZA	KSB	UMA 200 90/21	SUMERGIBLE	135 HP	B41034	N/A	USADO	REPARADO	POZO -73	Salvador Valadez vela


Justificación

ESTE EQUIPO FUE REPARADO POR EL PROVEEDOR SALVADOR VALADEZ VELA, EL DÍA 25 DE MARZO 2019, POSTERIORMENTE SE INSTALÓ EL DÍA 20 DE ABRIL 2019 EN EL POZO 73 UBICADO EN CD. INDUSTRIAL, SE DIAGNOSTICÓ EN SU INSTALACIÓN QUE SE ELEVARON LAS CORRIENTES EN LAS TRES LINEAS., SE REGRESA AL PROVEEDOR PARA SU DIAGNÓSTICO Y GARANTÍA ATENDIENDO EL FOLIO **0002377979**


SOLICITA
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTO DE POZOS


AUTORIZA
GARRET MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


ENTREGA
Juan Alberto barragán
Electromecánico


REPARA
PROVEEDOR
Salvador Valadez vela

PARA SU CONOCIMIENTO
J. ENCARNACION
ORDENACION DE REPARACIONES
GERENTE DE OPERACION Y MANTO

PARA SU CONOCIMIENTO
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bivd. Juan José Torres Landá No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx



TARJETA INFORMATIVA


POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE, QUE EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019 FUE REPARADO EQUIPO DE BOMBEO (1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB MODELO UPA200B 80/8 N°SERIEB41034, 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA KSB MODELO UMA 200 90/21 SERIE B41034) POR EL PROVEEDOR **SALVADOR VALADEZ VELA**.

SE INSTALÓ EL DÍA 20 DE ABRIL 2019 EN EL POZO 73 UBICADO EN CD. INDUSTRIAL, SE DIAGNOSTICÓ POR EL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POZOS QUE EN SU INSTALACIÓN SE ELEVARON LAS CORRIENTES EN LAS TRES LÍNEAS DEL EQUIPO DE BOMBEO LO CUAL SE OPTÓ POR APAGAR EL POZO Y PROCEDER A LA DESINSTALACIÓN.

SE NOTIFICA AL PROVEEDOR DE DICHO SUCESO, **SALVADOR VALADEZ VELA** DIAGNOSTICA QUE EFECTIVAMENTE ES CAUSA DE UNA MALA REPARACIÓN SE REGRESA AL PROVEEDOR PARA SU GARANTÍA.

SE COMPROMETE EL PROVEEDOR **SALVADOR VALADEZ VELA** A SER VÁLIDA LA GARANTÍA DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y ASÍ MISMO REALIZAR MANIOBRA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SIN NINGÚN COSTO.

MANIOBRA

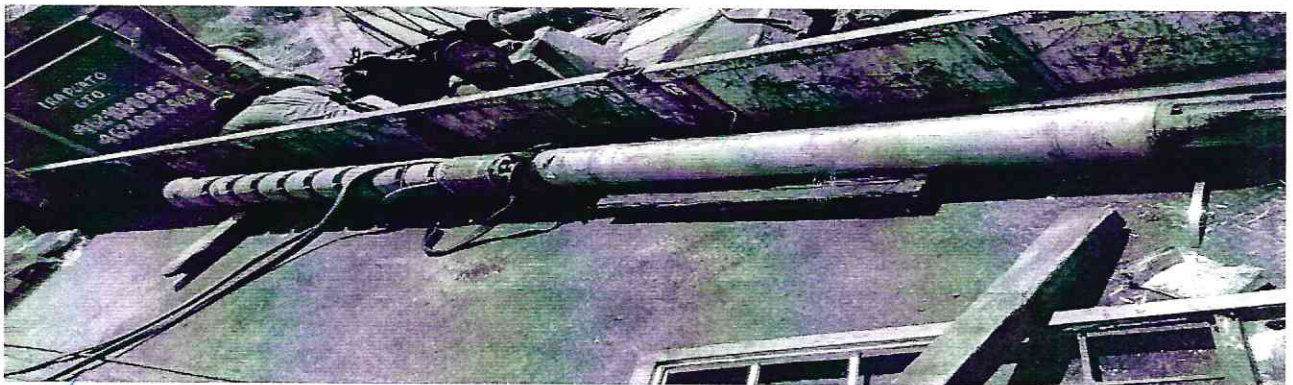

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESÚS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 73 "CIUDAD INDUSTRIAL"

El día 20 de abril del 2019 (terminando a las 10:00 pm), se realizó la maniobra de instalación de equipo de bombeo **NUEVO (RQ-41768)**

INSTALACIÓN

- 22 Tramos de tubo de 6" x6.10 mts.
- 140 mts de cable sumg.cal.3 x 2/0.
- 135 mts de poliducto de 1".
- Bomba sumergible marca KSB modelo UPA 250C 150/3F serie 19040005
- Motor sumergible marca KSB modelo UMA-200D 75/21 serie 19030079

MANIOBRA



[Handwritten signature]
#6211

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

[Handwritten signature]

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

lunes, 29 de abril de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 68

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: LAS ERAS (GÓMEZ MORÍN)

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA



JOSÉ MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA



JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.



J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR



J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA


POZO 68 LAS ERAS (GÓMEZ MORÍN)

El día 29 de abril del 2019, se realizó la maniobra desinstalación de equipo de bombeo por daño mecánico y eléctrico.

DESINSTALACIÓN

- 1 Bomba sumergible marca INDAR modelo UGP -1010-06 pasos acoplada a un motor sumergible marca INDAR 165 HP modelo ML—25-3/070 N° IA101417.
- 20 Tramos de tubo de 6" x 6.10 Mts.
- 1 cabezal de descarga acoplada a un tramo de tubo de 6" x 3.05 Mts.
- 130 Mts de Poliducto de 1"
- 130 Mts de Cable sumergible Cal. 3 x 3/0 en paralelo

MANIOBRA

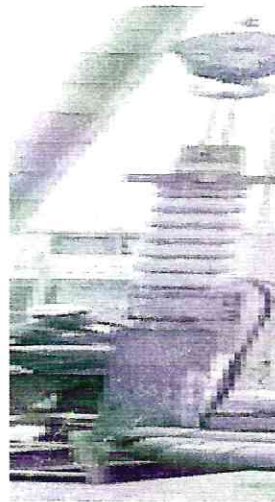

[Handwritten signature]
#6811

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

[Handwritten signature]

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato. Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



Fecha: 08/05/19
 Hora: 10:00 AM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	MOTOR	EQUIPO	INDAR	UGP-1010-06	Sumergible	165 HP	IA101417	N/A	USADO	DAÑADO	POZO-68
1	BOMBA	EQUIPO	INDAR	SIN PLACA 6PASOS	sumergible	N/A	IA101417	N/A	USADO	DAÑADO	POZO-68

Justificación

Este Equipo fue desinstalados del pozo 68 ubicado en Las Eras (Gómez Morín) este equipo presenta daño mecánico y eléctrico Se entrega a control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico para su resguardo, motor (próxima reparación con una reparación) bomba (próxima reparación cuenta con una reparación)
 Atendiendo el folio: **0002383256**

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARFAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MARGO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 Miguel Flores Santoye
 Electromecánico

RECIBE
 JOSÉ ERNESTO
 JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONTROL Y VALIDAR
 J. ENCARNAJON
 OROZCO COLARQUIBOS
 GERENTE DE OPERACION Y MANTTO

VALIDO
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAQUETZ
 CONTROL PATRIMONIAL



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

lunes, 27 de mayo de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 34

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: COLONIA IRAPUATO

SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN ORDOÑEZ COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

TARJETA INFORMATIVA

POZO RURAL 34 "COLONIA IRAPUATO"

EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2019 SE REALIZÓ MANIOBRA DESINSTALACION., ATENDIENDO OFICIO CON NÚMERO 5005 DEL DEPARTAMENTO DE BIENES, SERVICIOS Y SALUD AMBIENTAL OBSERVANDO ASÍ EL PRIMER PUNTO CON LA ESPECIFICACIÓN SIGUIENTE:


Nº 11 IRREGULARIDAD NO CUENTA CON SELLO SANITARIO

SE REALIZA MANIOBRA PARA INSTALAR SELLO SANITARIO


DESINSTALACION

- 19 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6.10MTS.
- 120 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL.3 X 1/0.
- 117 MTS DE MANGUERA PARA SONDEO DE 1".
- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULDS MODELO 9RCLC-3 SERIE G171 ACOPLADA A UN MOTOR ELÉCTRICO KSB MODELO UMA-200B75/21 DE 114 HP CON SERIE A21203.

Maniobra

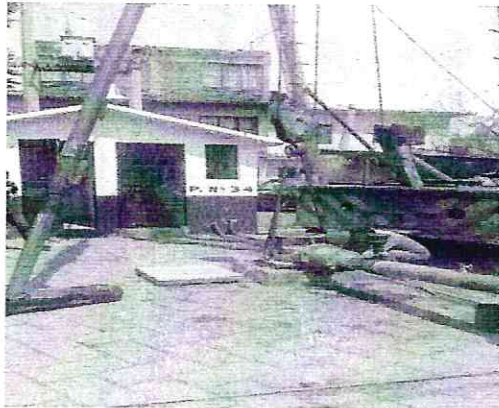

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

jueves, 09 de mayo de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 83

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: LAS ERAS

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

POZO 83 "LAS ERAS"

El día 09 de mayo del 2019 se realizo maniobra desinstalación de equipo de bombeo por presentar daño eléctrico en el motor sumergible

DESINSTALACION

- 20 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6.10 MTS.
- 2 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 3.05 MTS. (UNO UNIDO A CABEZAL DE DESCARGA Y OTRO A LA BOMBA.)
- 120 MTS. DE POLIDUCTO DE 1 ¼"
- 120 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 4/0
- 15 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE EN PARALELO CAL. 3 X 1/0.
- 1 BOMBA SUM. MARCA GABRIEL MODELO 9JMBHC/2 PASOS NÚMERO DE SERIE G664.
- 1 MOTOR SUM. MARCA GABRIEL DE 100 HP NÚMERO DE SERIE 751680453

MANIOBRA




RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESÚS-BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 17/05/19
 Hora: 10:00 AM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
01	BOMBA	EQUIPO	GABRIEL	9JMBHC/2	SUMERGIBLE	SIN DATO	G664	SIN DATO	USADO	DANADO	POZO-83
01	MOTOR	EQUIPO	GABRIEL	SIN DATO	SUMERGIBLE	100 HP	751680453	SIN DATO	USADO	DANADO	POZO-83

Justificación

ESTE EQUIPO DE BOMBEO SE DESINSTALO DEL POZO 83 EN LA COLONIA LAS ERAS., POR PRESENTAR FALLA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. SE ENTREGA ACOPLADO A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACÉN QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER MECÁNICO. PARA SU RESGUARDO Y POSTERIORMENTE MANDARSE A REVISIÓN Y REPARACIÓN YA QUE NO CUENTA CON NINGÚN REGISTRO DE REPARACIÓN. ATENDIENDO EL FOLIO 0002390804
 -SE ANEXA DICTAMEN

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARFAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 OMAR JUAREZ PADILLA
 ANALISTA B

RECIBE
 JOSE ERNESTO
 JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONTROL
 I. ENCABEZADO
 OROZCO COVARUBIAS
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

VALIDA
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
 Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
 www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

POZO 83 "LAS ERAS"

El día 09 de mayo del 2019 se realizó maniobra instalación de equipo de bombeo NUEVO

INSTALACIÓN

- 20 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6.10 MTS.
- 2 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 3.05 MTS. (UNO UNIDO A CABEZAL DE DESCARGA Y OTRO A LA BOMBA.)
- 120 MTS. DE POLIDUCTO DE 1 ¼"
- 120 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 4/0
- 15 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE EN PARALELO CAL. 3 X 1/0.
- 1 BOMBA SUM. MARCA KSB MODELO UPA 250C 150/3H SERIE 19040006
- 1 MOTOR SUM. MARCA KSB MODELO UMA-200D 65/21 SERIE K180052-04 CAPACIDAD 103.2 HP

MANIOBRA




RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

martes, 07 de mayo de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. RURAL 3

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: ALDAMA GTO

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA



POZO RURAL 3 "ALDAMA GTO"

EL DÍA 07 DE MAYO SE REALIZÓ MANIOBRA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON RELACIÓN A LA OBRA DENOMINADA "PERFORACIÓN DE POZO EN ALDAMA" BAJO CONTRATO N° JAPAMI/IR/PRODDER/2018-04

DESINSTALACION

- 29 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6.10 MTS
- 176.9 METROS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 1/0
- MOTOR SUMERGIBLE MARCA LUBI MODELO: L86100-H CON N° SERIE: 21901080 DE 100 HP
- BOMBA SUMERGIBLE MARCA LUBI MODELO: W60/22

MANIOBRA

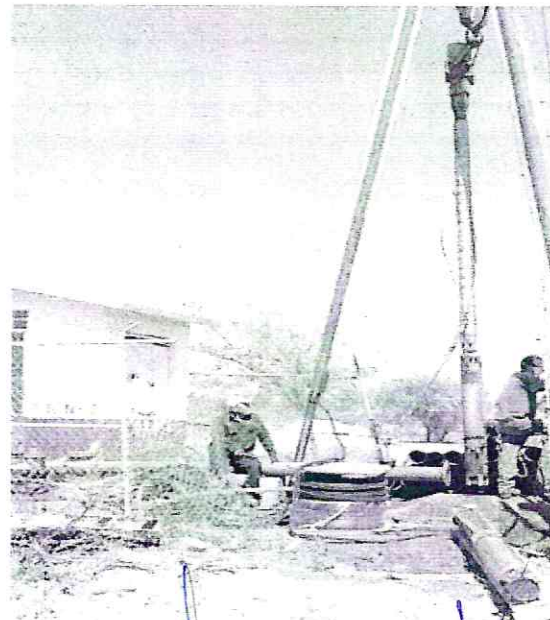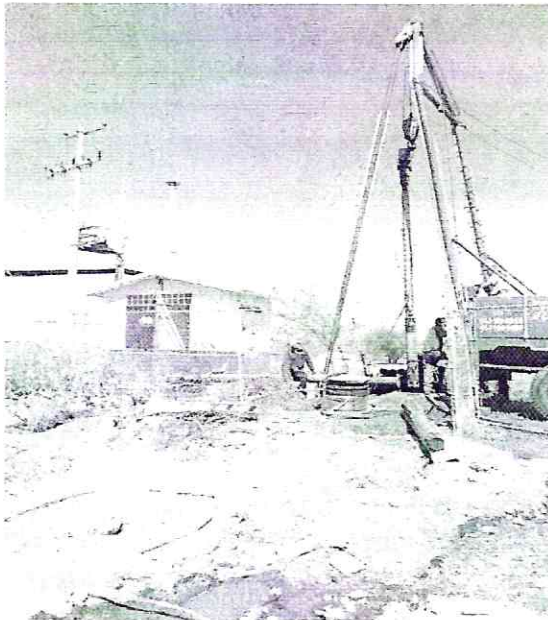


RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 08/05/19
 Hora: 01:00 PM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
176.5	CABLE 3 X 1/0)AWG	METROS	CONDELMEX	N/A	Sumergible	1/0	N/A	N/A	Usado	Buena	RURAL-3

Justificación

CABLE DESINSTALADO DEL POZO RURAL-3 UBICADO ALDAMA. SE ENTREGA A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACEN QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER MECANICO PARA SU RESGUARDO.

#0911

SOLICITA

JOSE MANUEL FARRAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

RECIBE

JOSE ERNESTO
 JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONTROL Y MANTENIMIENTO

OPERACION Y MANTENIMIENTO

GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

VALIJA


MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

ENTREGA

Miguel Flores Santoyo
 Electricista



Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 17/05/19
 Hora: 10:00 AM

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
01	BOMBA	EQUIPO	LUBI	W60/22	SUMERGIBLE	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	USADO	DAÑADO	P-RURAL3
01	MOTOR	EQUIPO	LUBI	L86100-H	SUMERGIBLE	100 HP	21901080	SIN DATO	USADO	DAÑADO	P-RURAL3

Justificación

Este equipo de bombeo se desinstalo del Pozo Rural-3 ubicado en Aldama por presentar falla mecánica y presentar bajo gasto. SE ENTREGA ACOPLADO A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACÉN QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER MECÁNICO. PARA SU RESGUARDO Y POSTERIORMENTE MANDARSE A REVISIÓN Y REPARACIÓN YA QUE NO CUENTA CON NINGÚN REGISTRO DE REPARACIÓN. ATENDIENDO EL FOLIO 0002388579
 -SE ANEXA DICTAMEN

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARFAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 OMAR SUAREZ PADILLA
 ANALISTA B

RECIBE
 JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU COORDINACIÓN
 J. ENCARNACION
 OROZCO COLARILLADO
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

VALIDA
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL



TARJETA INFORMATIVA



POZO RURAL 3 "ALDAMA GTO"

EL DÍA 07 DE MAYO SE REALIZÓ MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON RELACIÓN A LA OBRA DENOMINADA "PERFORACIÓN DE POZO EN ALDAMA "BAJO CONTRATO N° JAPAMI/IR/PRODDER/2018-04 LA CUAL FUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO Y CABLE SUMERGIBLE NUEVO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA

INSTALACIÓN

- 29 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6.10 MTS
 - 179.52 METROS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 2/0 AWG MARCA VILLA REAL DIVISION EQUIPOS S.A DE C.V (NUEVO)
 - MOTOR SUMERGIBLE MARCA KSB MODELO UMA200D75/21 SERIE 19040155 DE 120.7 HP (NUEVO)
 - BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB MODELO UPA 200B-80/8 SERIE 19040155
- NOTA: EN LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA SE ESPECIFICA EL NÚMERO DE SERIE 19040155 Y EN EL CUERPO DE TAZONES SE TIENE GRABADO EL NÚMERO 19040115 SIN LA LEYENDA QUE LO IDENTIFIQUE COMO NÚMERO DE SERIE (NUEVO)

MANIOBRA

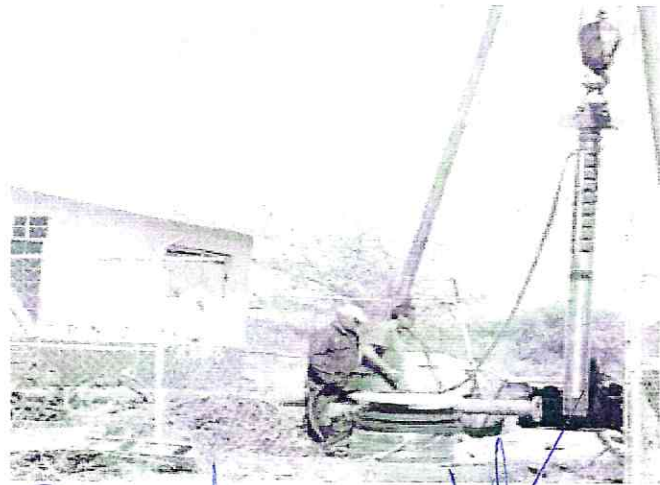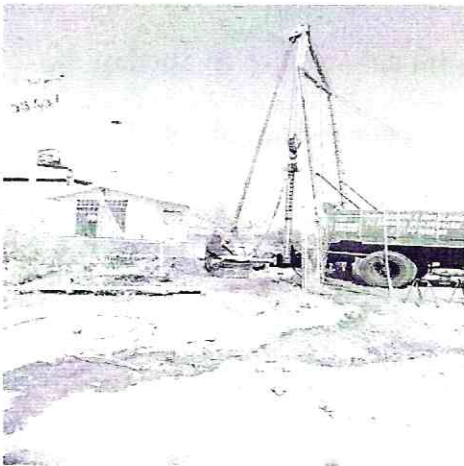


RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESÚS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo
