

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6
REG. PATRONAL : B47-29091 10-7
CANAL CORIA No. 143
COL. MORELOS C.P. 36584
IRAPUATO, GTO.
TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 50/2020

06 DE MAYO DEL 2020.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
	<u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u>	
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 B5 EL DIA 05 DE MARZO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 B4 EL DIA 20 DE MARZO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 B1 EL DIA 30 DE MARZO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 B2 EL DIA 31 DE MARZO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 B4 EL DIA 31 DE MARZO (2 SERVICIOS EL MISMO DIA)	\$10,000.00
NOTA:	ESTOS COSTOS SON + I.V.A. PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR	

HORA O POR SERVICIO

SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
	<u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u>	
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 B5 EL DIA 01 DE ABRIL	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN PLANTA PTAR SERVICIO DE 7 HRS EL DIA 06 DE ABRIL	\$14,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 07 DE ABRIL	\$16,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 22 DE ABRIL	\$ 16,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 23 DE ABRIL	\$ 16,000.00
NOTA:	ESTOS COSTOS SON + I.V.A. PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	

ACEPTO

ATENTAMENTE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO

20 de febrero del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ modelo 20PO/2E , serie N03A5032/1, ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


10,000.00
+ IVA



20-02-20
ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


20-02-20
SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


25/02/20
RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 20 de febrero de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación miércoles, 26 de febrero de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-18
Fecha de Instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
372,000.00	120,000.00	\$12,000.00	108,000.00	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-18
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N03A5032/1
Volts: 440 Potencia: 800 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

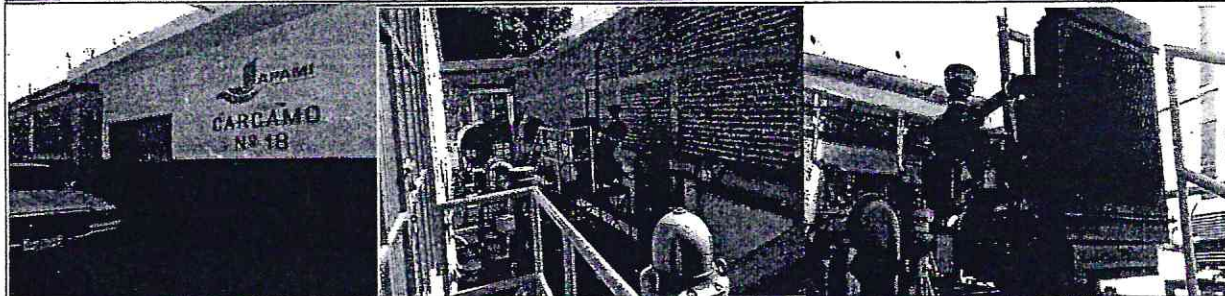

Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró 20-02-20
Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó 20-02-20
José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó 25/02/20
Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo. [Signature]
J. Encarnacion Ocho Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

[Signature]
Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO


20 de febrero del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B5) marca BNJ modelo 20PO/2E , serie N05M5927, ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

10,000.00
+ IVA


28-02-20
ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


20-02-20
SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


25/02/20
RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 20 de febrero de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación miércoles, 26 de febrero de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-18
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
372,000.00	108,000.00	\$12,000.00	96,000.00	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-18
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N05M5927
Volts: 440 Potencia: 1072 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Ortega Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó


Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO


09 de marzo del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06M6377/2 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa


Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


09/03/20
ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


09-03-20
SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


09/03/20
RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 9 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO
Fecha de desinstalación: Jueves, 19 de marzo de 2020
Fecha de Instalación: _____
Grua: Interna Externa
No. De Pozo/Carcamo: C-23
Hora: 9:00:00 a.m.

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06M6377/2
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

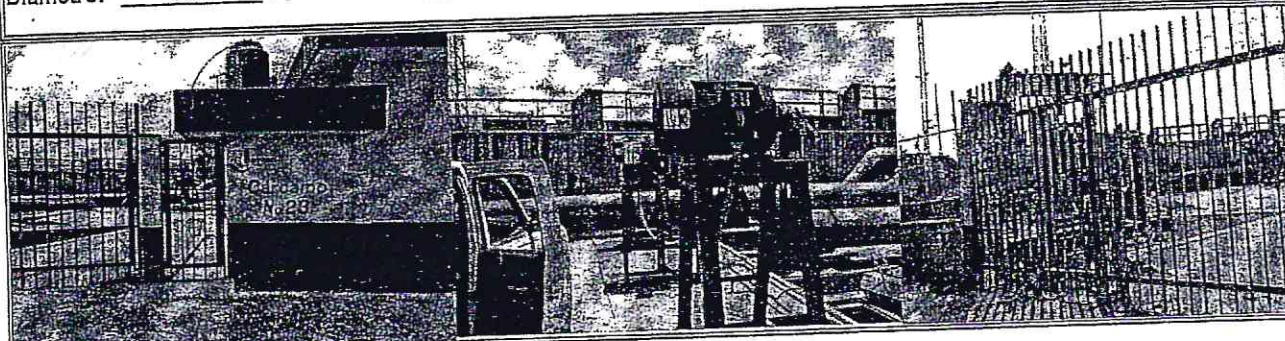

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboro:
Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor


Supervisó:
José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó:
Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.:
J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



TARJETA INFORMATIVA





CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO


09 de marzo del 2020

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N10L8651/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa


Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


09-03-20
ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


10,000.00
+ IVA
SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


09/03/20
RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 9 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO
Fecha de desinstalación: miércoles, 18 de marzo de 2020
Fecha de Instalación: _____
Grua: Interna Externa
Hora: 9:00:00 a.m.
No. De Pozo/Carcamo: C-23

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N10L8651/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

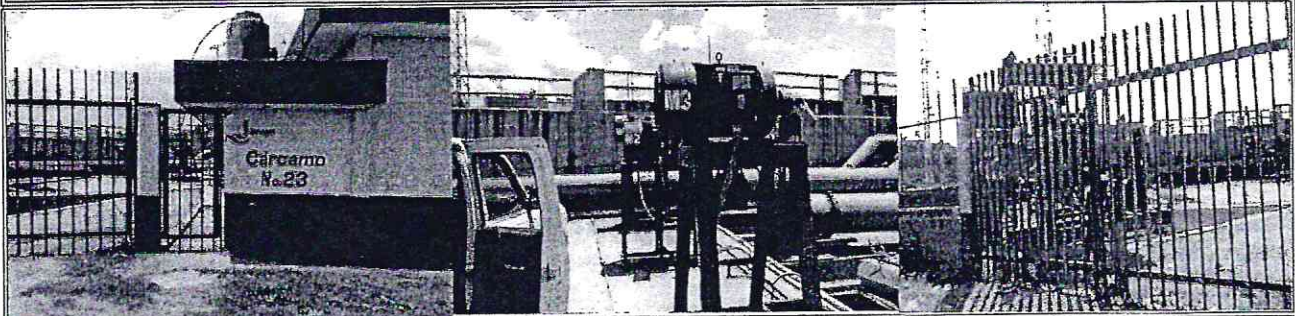

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos

TARJETA INFORMATIVA




IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2015 - 2016

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

09 de marzo del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06M6377/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa


Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.



 09-03-20
 ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
 SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS



 09-03-20
 SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
 JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

10,000.00
 + IVA


 09/03/20
 RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
 DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


 CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
 GERENTE DE OP. Y MTTO


 AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
 DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 9 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grúa: Interna Externa
 Fecha de desinstalación martes, 17 de marzo de 2020 Hora: 9:00:00 a.m. No. De Pozo/Carcamo C-23
 Fecha de instalación

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
 Marca: BNJ Modelo: 24PO/2E Serie No: N06M6377/1
 Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

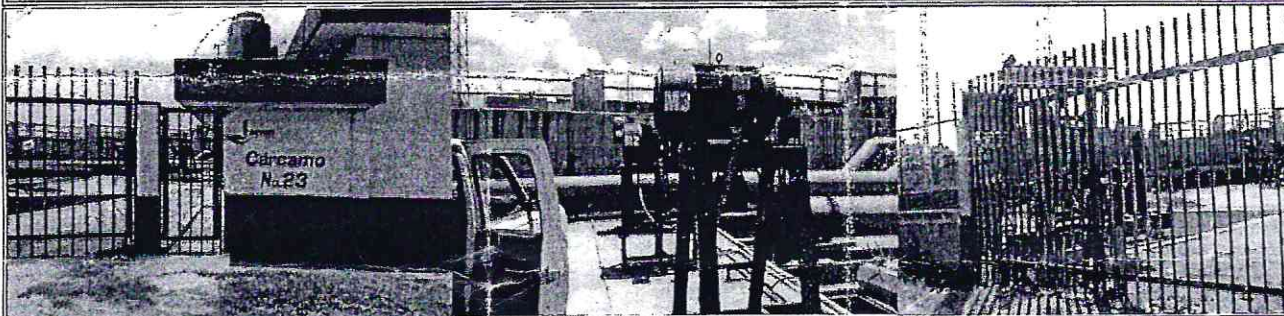

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

09-03-20
Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

09-03-20
José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

09/03/20
Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Quiroz Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 9 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
 Fecha de desinstalación martes, 17 de marzo de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
 Fecha de Instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
 Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06M6377/1
 Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Dlametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

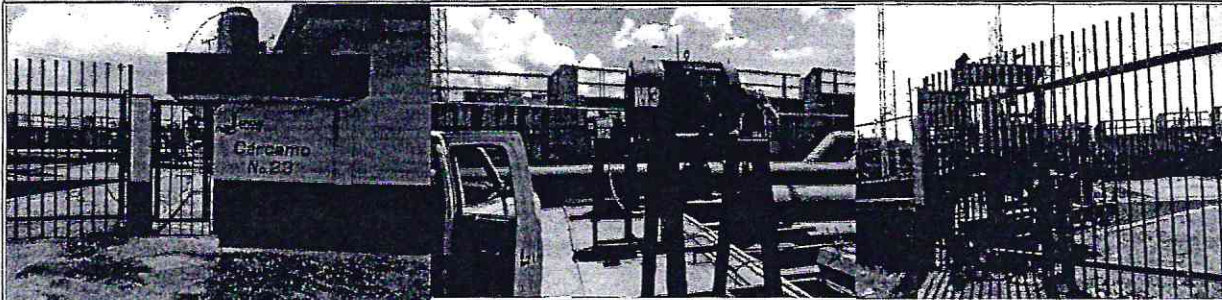

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos

TARJETA INFORMATIVA




CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

09 de marzo del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B5) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06Y6470/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


10,000.00
 + IVA


 09-03-20
 ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
 SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


 09-03-20
 SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
 JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


 09/03/20
 RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
 DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


 CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
 GERENTE DE OP. Y MTTTO


 AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
 DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 9 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO
Fecha de desinstalación: viernes, 20 de marzo de 2020
Fecha de instalación: _____
Grua: Interna Externa
No. De Pozo/Carcamo: C-23

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06Y6470/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

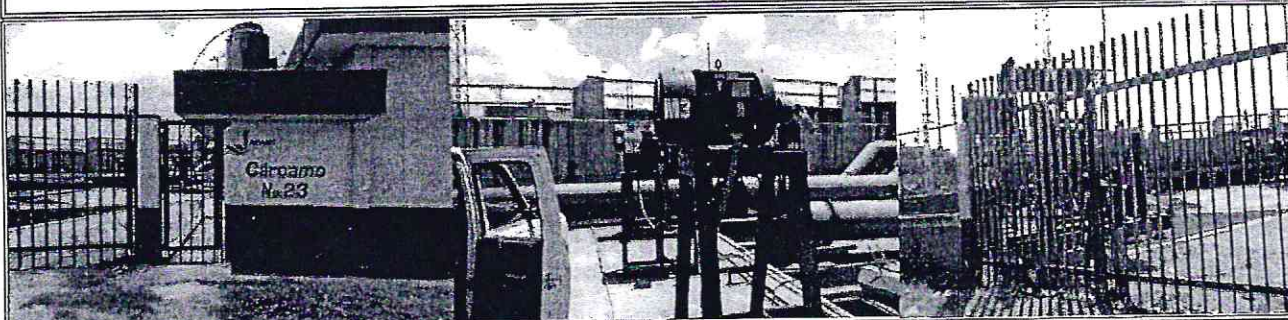

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró:
Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó:
José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Cárcamos

Revisó:
Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.:
J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


MACRO-CARCAMO PTAR SALIDA PUEBLO NUEVO

09 de marzo del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ modelo 24PO/3E, serie N10Y8538, ubicado en el macro-cárcamo ptar salida pueblo nuevo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2020, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

7 horas
14,000.00
+ IVA


09-03-20
ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


09-03-20
SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


09/03/20
RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 9 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: PTAR SALIDA PUEBLO NUEVO
 Fecha de desinstalación: jueves, 12 de marzo de 2020
 Fecha de instalación: _____
 Grua: Interna Externa
 Hora: 9:00:00 a.m.
 No. De Pozo/Carcamo: PTAR 1

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	14,000.00 \$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: PTAR 1
 Marca: BNJ Modelo: 24PO/3E Serie No: N10Y8538
 Volts: 440 Potencia: 1,154 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relaciòn: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

09/03/20
Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

09/03/20
José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

09/03/20
Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos.

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2015 - 2018

CARCAMO # 14 LAGUNILLA

30 de marzo del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba tornillo (BT1) modelo ICO, serie CBTD00, ubicada en el cárcamo 14 de Lagunilla I, ya que este equipo fue reportado por José Francisco Zavala Hernández, con número de empleado 6764, el día 10 marzo del 2020 (operador del cárcamo) debido a que visualizo que las bandas del equipo ya mencionado se encontraban flojas, por lo que el departamento de mantenimiento de cárcamos abordó al cárcamo, remplazando las bandas acopladas entre motor y reductor, visualizando que el equipo continua aflojando las bandas y se mantiene vibrando excesivamente, ya que también se sustituyen dos tornillos capados de la plataforma donde se soporta el reductor de velocidad y se realizan mediciones de consumo de amperaje, los cuales están dentro de los parámetros de trabajo, se solicita el apoyo de taller de mantenimiento mecánico industrial (ing. José Antonio Santana) para visualizar las condiciones de trabajo del equipo. El ing. José Antonio Santana visualiza el equipo como se encuentra trabajando y explicando que de acuerdo a su experiencia de estos equipos y con equipo cerrado, que el equipo, ya representa desgaste en la chumacera inferior y ocasiona que el rodamiento de la flecha superior está absorbiendo los movimientos irregulares.

Cabe mencionar que para la desinstalación de este equipo será necesario ocupar, en la maniobra el apoyo de 2 grúas externas.


Handwritten notes:
 8 horas
 16,000.00
 + IVA




Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.




ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS



SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS



RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO



AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 30 de marzo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA I
 Fecha de desinstalación: Jueves, 02 de abril de 2020
 Fecha de instalación: _____
 Grúa: Interna Externa X
 No. De Pozo/Carcamo: C-14

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$16,000.00	N/A	CABE MENCIONAR QUE PARA LA MANIOBRA DE ESTE EQUIPO SERA NECESARIO EL APOYO DE 2 GRUAS EXTERNAS

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA TORNILLO Destino: C-14
 Marca: ICO Modelo: CBTD00 Serie No: N/A
 Volts: 440 Potencia: 480 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO (BOMBA TORNILLO) SE DESINSTALARA PARA VISUALIZAR SU ESTADO FISICO DE COMPONENTES DEBIDO A QUE EL MISMO REPRESENTA ECSESIVA VIBRACION.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrublas Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todas

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14 LAGUNILLA


22 de abril del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de la instalación de la bomba tornillo (BT1) modelo ICO, serie CBTD00, ubicada en el cárcamo 14 Lagunilla I, ya que este equipo fue reparado por taller de mantenimiento mecánico industrial (Ing. José Antonio Santana Vargas) y es necesario colocarlo en su lugar de operación, para el desalojo de agua captada en fosa de cárcamo. Cabe mencionar que para la instalación de este equipo será necesario ocupar, en la maniobra el apoyo de 2 grúas externas.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



8 horas
16 000
FIVA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 22 de abril de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA I Grúa: Interna Externa X
Fecha de desinstalación viernes, 17 de abril de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14
Fecha de instalacion jueves, 23 de abril de 2020

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$16,000.00	N/A	CABE MENCIONAR QUE PARA LA MANIOBRA DE ESTE EQUIPO SERA NECESARIO EL APOYO DE 2 GRUAS EXTERNAS

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA TORNILLO Destino: C-14
Marca: ICO Modelo: CBTD00 Serie No: N/A
Volts: 440 Potencia: 480 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO ES NECESARIO INSTALARLO EN SU LUGAR DE ORIGEN PARA EL DESALOJO DE AGUA CAPTADA EN FOSA, EQUIPO REPARADO POR TALLER DE MTTO. MECÁNICO INDUSTRIAL (ING. JOSÉ ANTONIO SANTANA VARGAS)

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró
Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó
José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó
Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.
J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


CARCAMO # 14 LAGUNILLA


22 de abril del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de la instalación de la bomba tornillo (BT1) modelo ICO, serie CBTD00, ubicada en el cárcamo 14 Lagunilla I, ya que este equipo fue reparado por taller de mantenimiento mecánico industrial (Ing. José Antonio Santana Vargas) y es necesario colocarlo en su lugar de operación para el desalojo de agua captada en fosa de cárcamo. Cabe mencionar que para la instalación de este equipo será necesario ocupar, en la maniobra el apoyo de 2 grúas externas.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 22 de abril de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA I
Fecha de desinstalación viernes, 17 de abril de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14
Fecha de instalación Jueves, 23 de abril de 2020
Grua: Interna Externa

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la manobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$16,000.00	N/A	CABE MENCIONAR QUE PARA LA MANIOBRA DE ESTE EQUIPO SERA NECESARIO EL APOYO DE 2 GRUAS EXTERNAS

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA TORNILLO Destino: C-14
Marca: ICO Modelo: CBTD00 Serie No: N/A
Volts: 440 Potencia: 480 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO ES NECESARIO INSTALARLO EN SU LUGAR DE ORIGEN PARA EL DESALOJO DE AGUA CAPTADA EN FOSA, EQUIPO REPARADO POR TALLER DE MITTO, MECÁNICO INDUSTRIAL (ING. JOSÉ ANTONIO SANTANA VARGAS)

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró
Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó
José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó
Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.
J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó
Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 67/2020

24 DE JUNIO DEL 2020.


PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
	<p align="center"><u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u></p> <p>MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 23 DE ABRIL</p>	\$16,000.00
	<p>MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 22 DE MAYO</p>	\$16,000.00
NOTA:	ESTOS COSTOS SON + I.V.A. PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	

ACEPTO


ATENTAMENTE



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



SILVESTRE HUERTA ACOSTA





TARJETA INFORMATIVA





CARCAMO # 14 LAGUNILLA


22 de abril del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de la instalación de la bomba tornillo (BT1) modelo ICO, serie CBTD00, ubicada en el cárcamo 14 Lagunilla I, ya que este equipo fue reparado por taller de mantenimiento mecánico industrial (Ing. José Antonio Santana Vargas) y es necesario colocarlo en su lugar de operación, para el desalojo de agua captada en fosa de cárcamo. Cabe mencionar que para la instalación de este equipo será necesario ocupar, en la maniobra el apoyo de 2 grúas externas.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 22 de abril de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA I

Grua: Interna Externa

Fecha de desinstalación: viernes, 17 de abril de 2020 Hora: 9:00:00 a. m.

No. De Pozo/Carcamo: C-14


Fecha de instalación: Jueves, 23 de abril de 2020

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la manobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$16.000.00	N/A	CABE MENCIONAR QUE PARA LA MANIOBRA DE ESTE EQUIPO SERA NECESARIO EL APOYO DE 2 GRUAS EXTERNAS

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA TORNILLO Destino: C-14
Marca: ICO Modelo: CBTD00 Serie No: N/A
Volts: 440 Potencia: 480 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

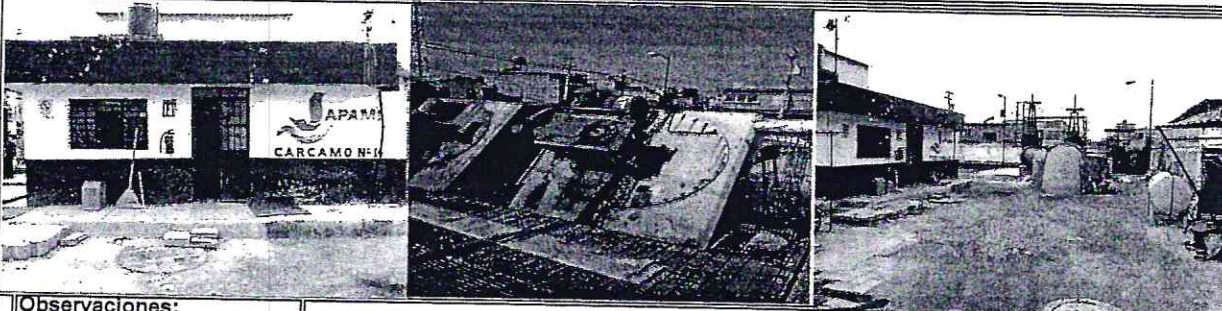

Observaciones:

ESTE EQUIPO ES NECESARIO INSTALARLO EN SU LUGAR DE ORIGEN PARA EL DESALOJO DE AGUA CAPTADA EN FOSA, EQUIPO REPARADO POR TALLER DE MTO. MECÁNICO INDUSTRIAL (ING. JOSÉ ANTONIO SANTANA VARGAS)

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cabarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



TARJETA INFORMATIVA




CARCAMO # 14 LAGUNILLA


20 de abril del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de la instalación de la bomba tomillo (BT2) modelo ICO, serie CBTD002, ubicada en el cárcamo 14 Lagunilla I, ya que este equipo fue reparado por taller de mantenimiento mecánico industrial (Ing. José Antonio Santana Vargas) y es necesario colocarlo en su lugar de operación, para el desalojo de agua captada en fosa de cárcamo. Cabe mencionar que para la instalación de este equipo será necesario ocupar, en la maniobra el apoyo de 2 grúas externas.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japamf.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 20 de mayo de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: LAGUNILLA I
Fecha de desinstalación: viernes, 17 de abril de 2020
Fecha de Instalación: viernes, 22 de mayo de 2020
Grua: Interna Externa
Hora: 9:00:00 a. m.
No. De Pozo/Carcamo: C-14

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la manobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$16,000.00	N/A	CABE MENCIONAR QUE PARA LA MANIOBRA DE ESTE EQUIPO SERA NECESARIO EL APOYO DE 2 GRUAS EXTERNAS

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA TORNILLO Destino: C-14
Marca: ICO Modelo: CBTD002 Serie No: N/A
Volts: 440 Potencia: 480 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

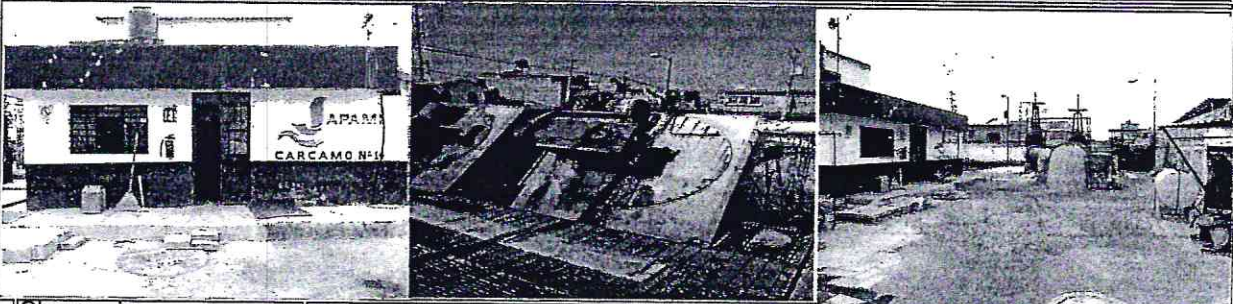

Observaciones:

ESTE EQUIPO ES NECESARIO INSTALARLO EN SU LUGAR DE ORIGEN PARA EL DESALOJO DE AGUA CAPTADA EN FOSA, EQUIPO REPARADO POR TALLER DE M.TTO. MECÁNICO INDUSTRIAL (ING. JOSÉ ANTONIO SANTANA VARGAS)

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orezos Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General
